
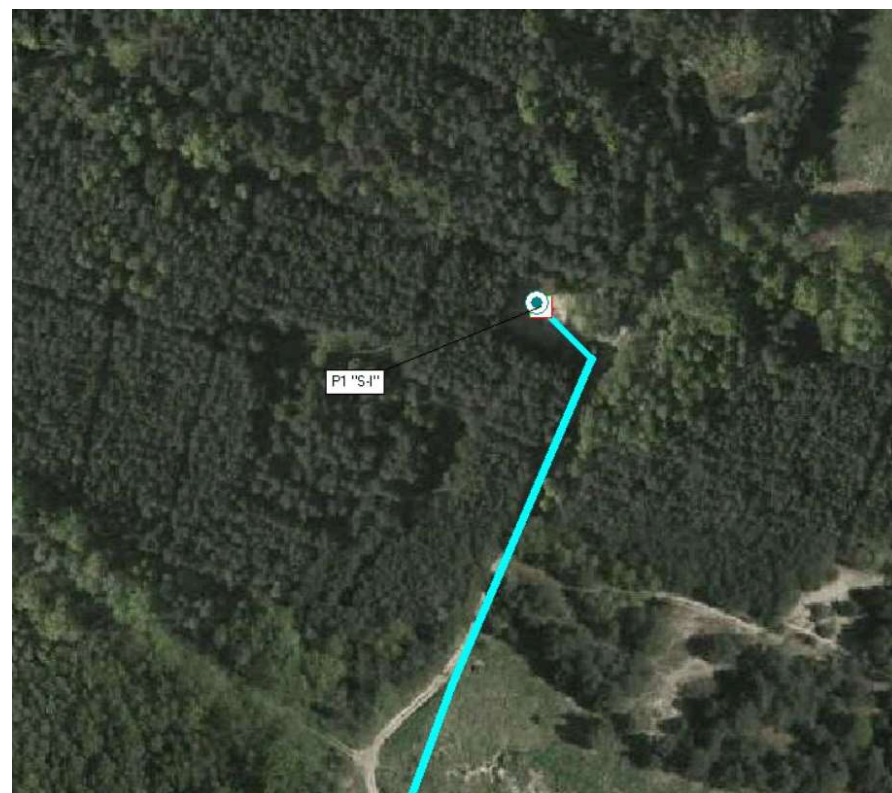


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Terytorium	Pomiar	DN rury
P1	PROJEKTOWANY	Studnia S-I ► I (magistrala)	S-I	Nad Stojadłem S-I	2057/1 Id działki : 180804_2.0131.2057/1	P i Q +/-	

Komentarz	Opis
Możliwość montażu rejestratora w szafie sterowniczej, możliwość zasilenia rejestratora napięciem sieciowym, możliwość wykorzystania wyjść impulsowych z obecnie prasującego przepływomierza.	Punkt zlokalizowany na Ujęciu „Nad Stojadłem” S-I

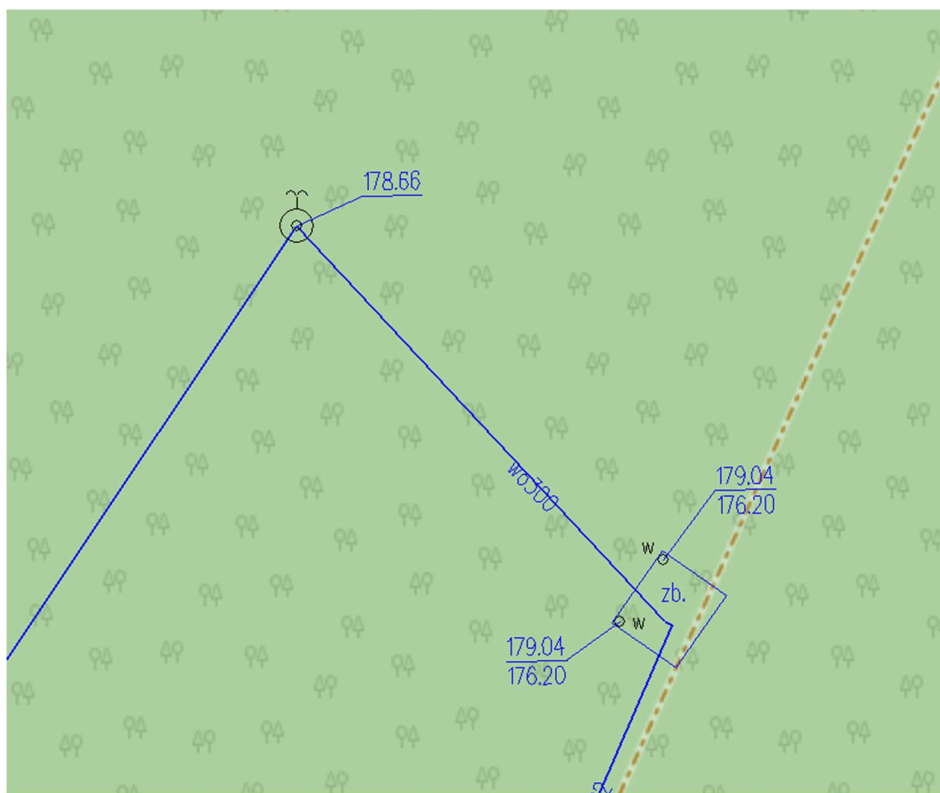


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Terytorium	Pomiar	DN rury
P2	PROJEKTOWANY	Studnia S-II ► I (magistrala)	S-II	Nad Stojadłem S-II	2066/13 Id działki : 180804_2.0131.2066/13	P i Q +/-	

Komentarz	Opis
Możliwość montażu rejestratora w szafie sterowniczej, możliwość zasilenia rejestratora napięciem sieciowym, możliwość wykorzystania wyjść impulsowych z obecnie prasującego przepływomierza.	Punkt zlokalizowany na Ujęciu „Nad Stojadłem” S-II

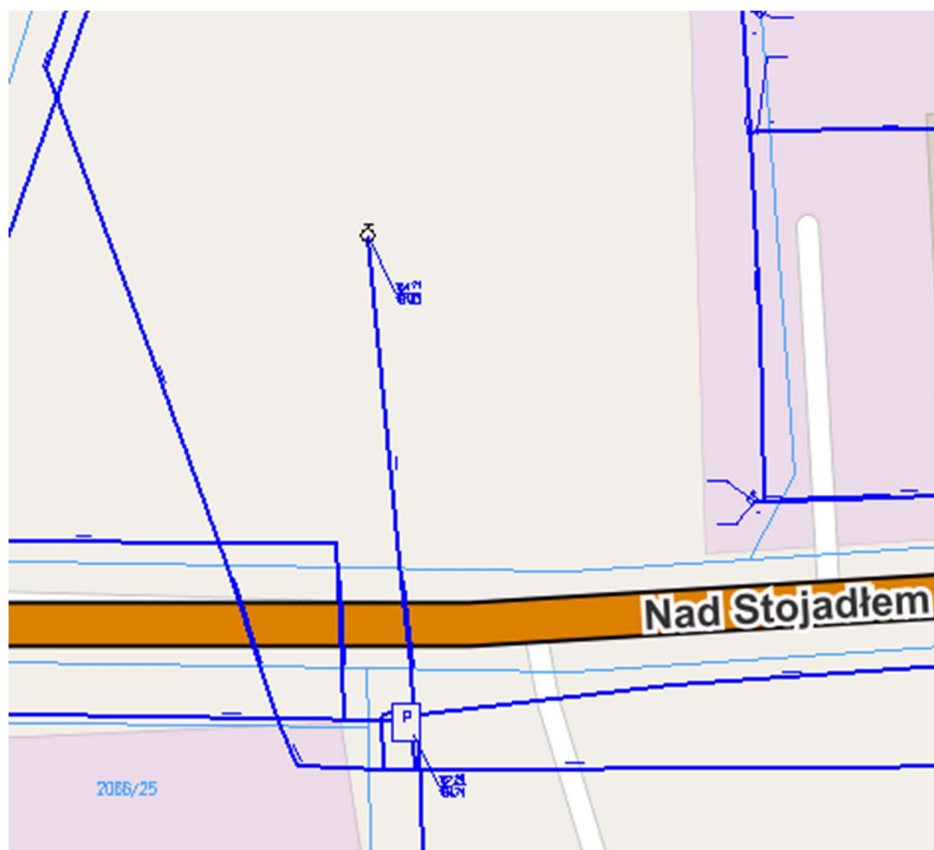


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Terytorium	Pomiar	DN rury
P3	PROJEKTOWANY	Studnia S-III bis ► I (magistrala)	S-III	Nad Stojadłem S-III bis	14/67 Id działki : 180801_1.0020.14/67	P i Q +/-	

Komentarz	Opis
Możliwość montażu rejestratora w szafie sterowniczej, możliwość zasilenia rejestratora napięciem sieciowym, możliwość wykorzystania wyjść impulsowych z obecnie prasującego przepływomierza.	Punkt zlokalizowany na Ujęciu „Nad Stojadłem” S-III bis

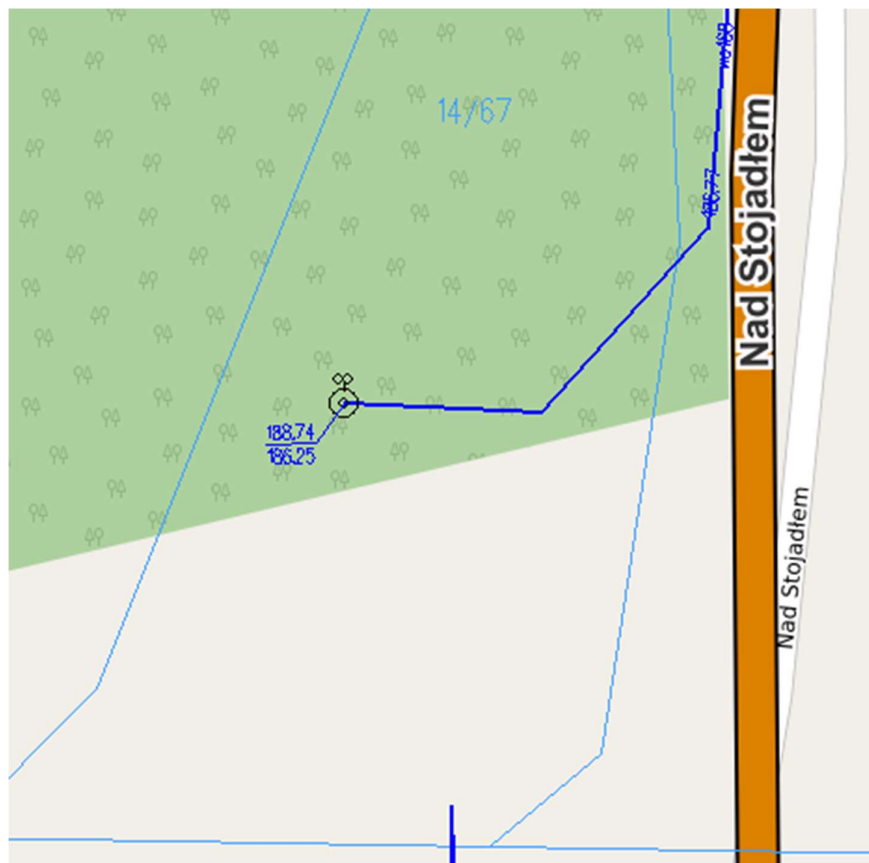


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P4	ISTNIEJĄCY	Studnia S-1 ► X	L-1	Ul. Lipy 1	3394/19 Id działki : 180801_1.0020.3394/19	P i Q +/-	

Komentarz	Opis
Istniejący pomiar L-1. Wykorzystuje wyjście impulsowe przepływomierza elektromagnetycznego. Rejestrator zamontowany w szafie sterowniczej.	Punkt zlokalizowany na Ujęcie „Lipy S-1”

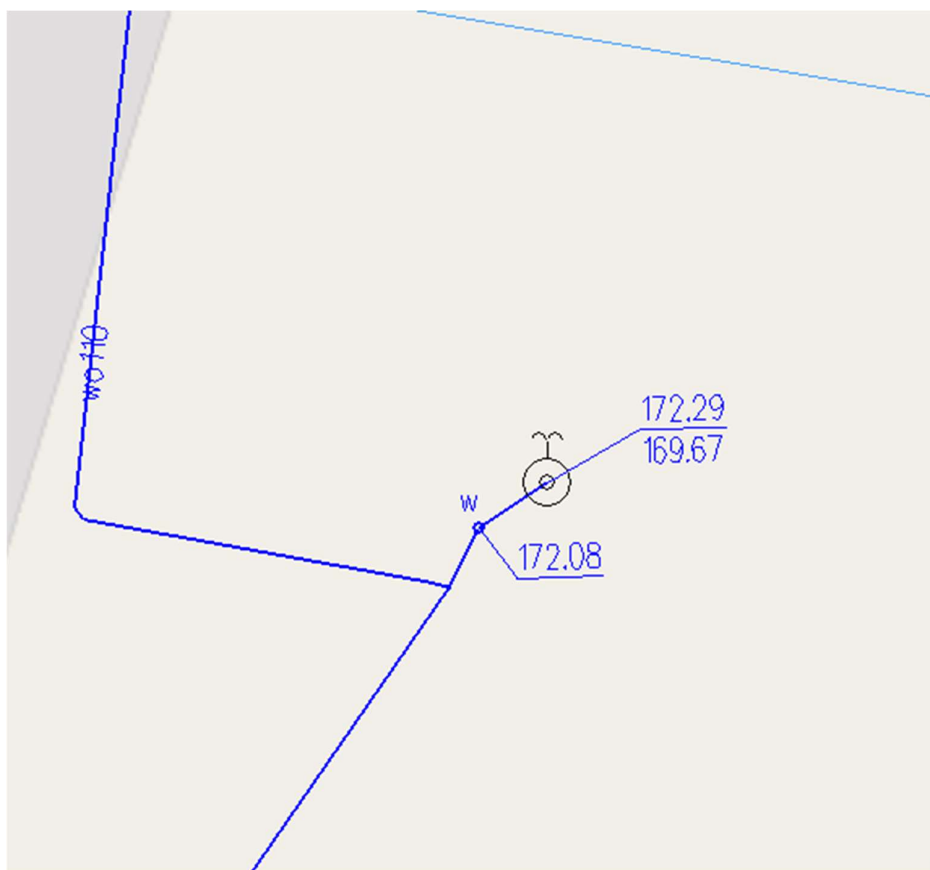

ZAŁĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P5	ISTNIEJĄCY	Studnia S-2 ► X	L-2	Ul. Lipy 1	3394/19 Id działki : 180801_1.0020.3394/19	P i Q +/-	

Komentarz	Opis
Istniejący pomiar L-2. Wykorzystuje wyjście impulsowe przepływomierza elektromagnetycznego. Rejestrator zamontowany w szafie sterowniczej.	Punkt zlokalizowany na Ujęcie „Lipy S-2”




ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P6	ISTNIEJĄCY	X ► IX	KP „L-1”	Komora pomiarowa terenu Ujęcia „Lipy S-1”	3394/19 Id działki : 180801_1.0020.3394/19	P i Q +/-	

Komentarz	Opis
Podziemna komora redukcyjno-pomiarowa Lipy 1. W komorze znajduje się m. in. reduktor ciśnienia, bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny, rejestrator ciśnienia.	Punkt zlokalizowany na terenie Ujęcie „Lipy S-1”


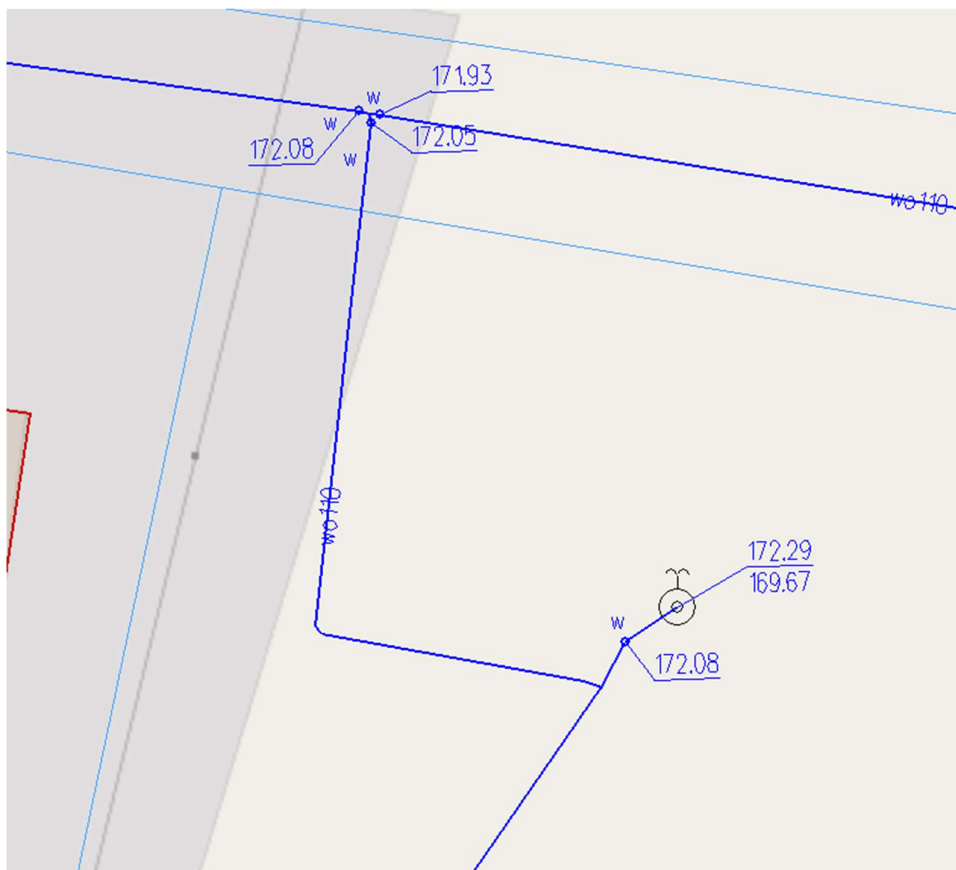


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P7	PROJEKTOWANY	I ► XV i I ► III	Przytorze	ul. Przytorze 2	14/26 Id działki : 180801_1.0020.14/26	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Ul. Hutnicza przy ogrodzeniu Fabryki Maszyn	

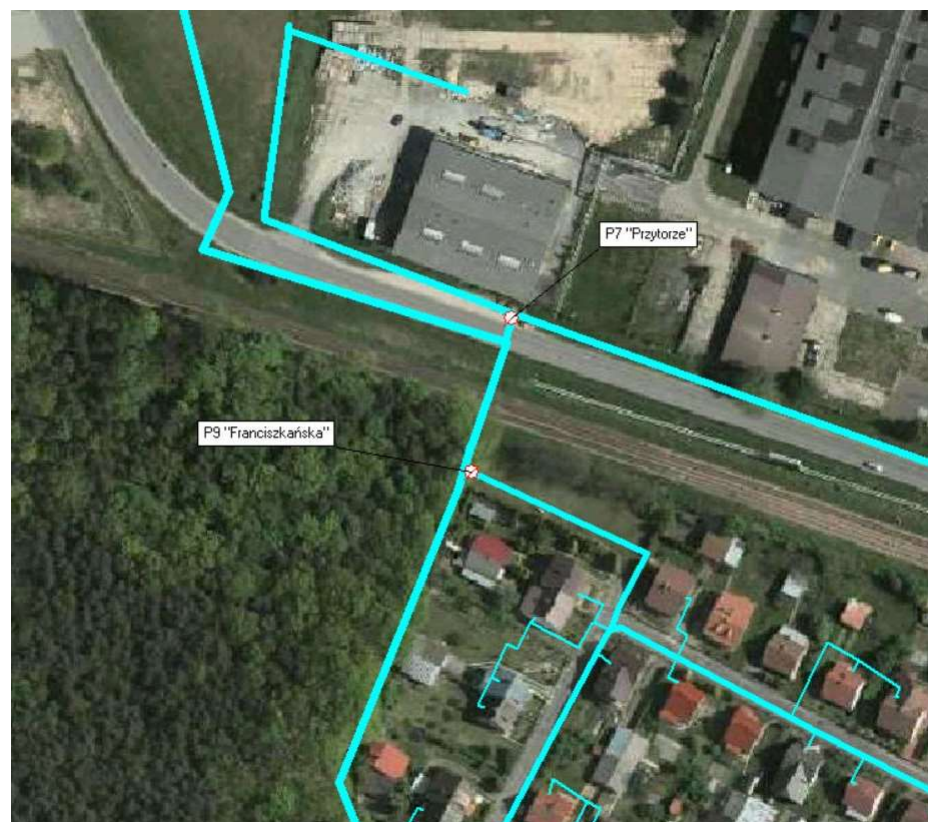
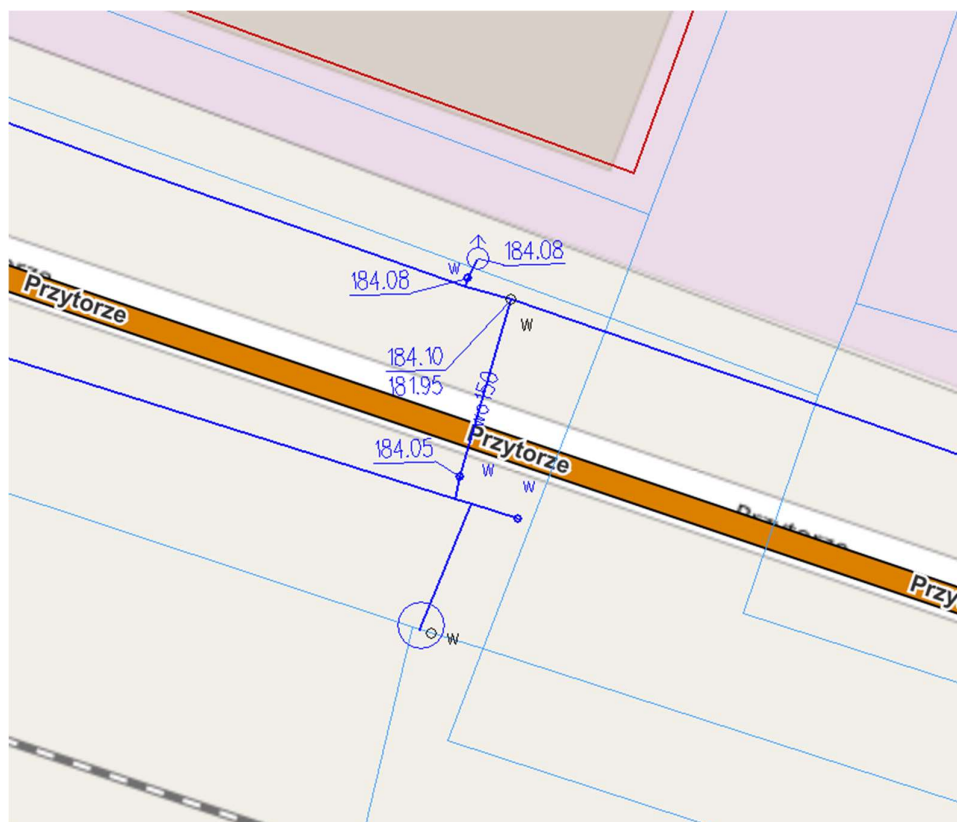


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P8	ISTNIEJĄCY	I (magistrala) ► VEOLIA	Veolia	Komora pomiarowa Veolia	2066/6 Id działki : 180801_1.0020.2066/6	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Hutnicza przy ogrodzeniu Fabryki Maszyn kierunek most, punkt zlokalizowany w pasie trawnika	

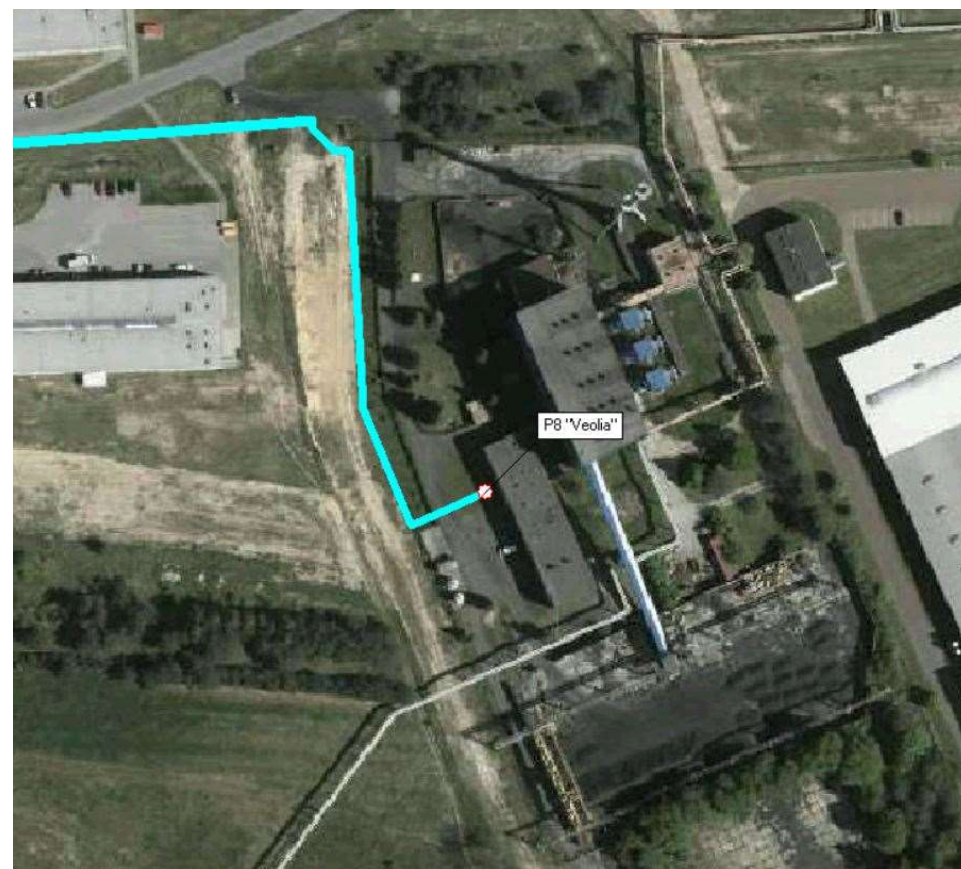
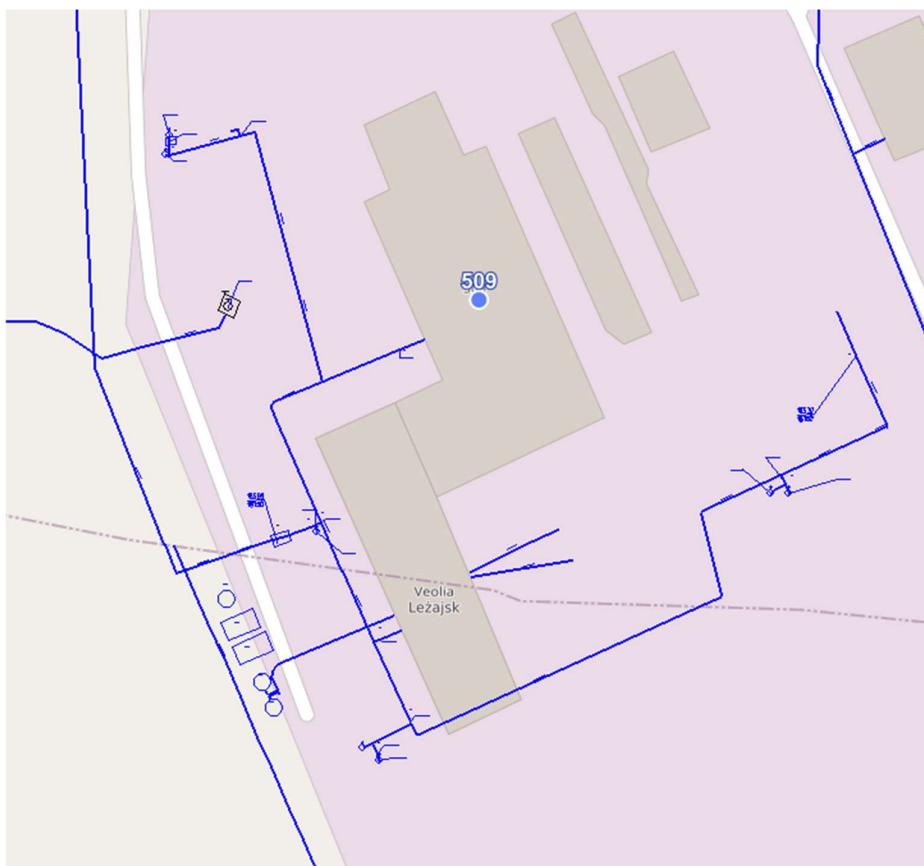


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P9	PROJEKTOWANY	I ► III	Franciszkańska	ul. Franciszkańska 11 (odwiert)	150/2 Id działki : 180801_1.0020.150/2	P i Q +/-	110

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Franciszkańska teren zielony (próbny odwiert ujęcia)	

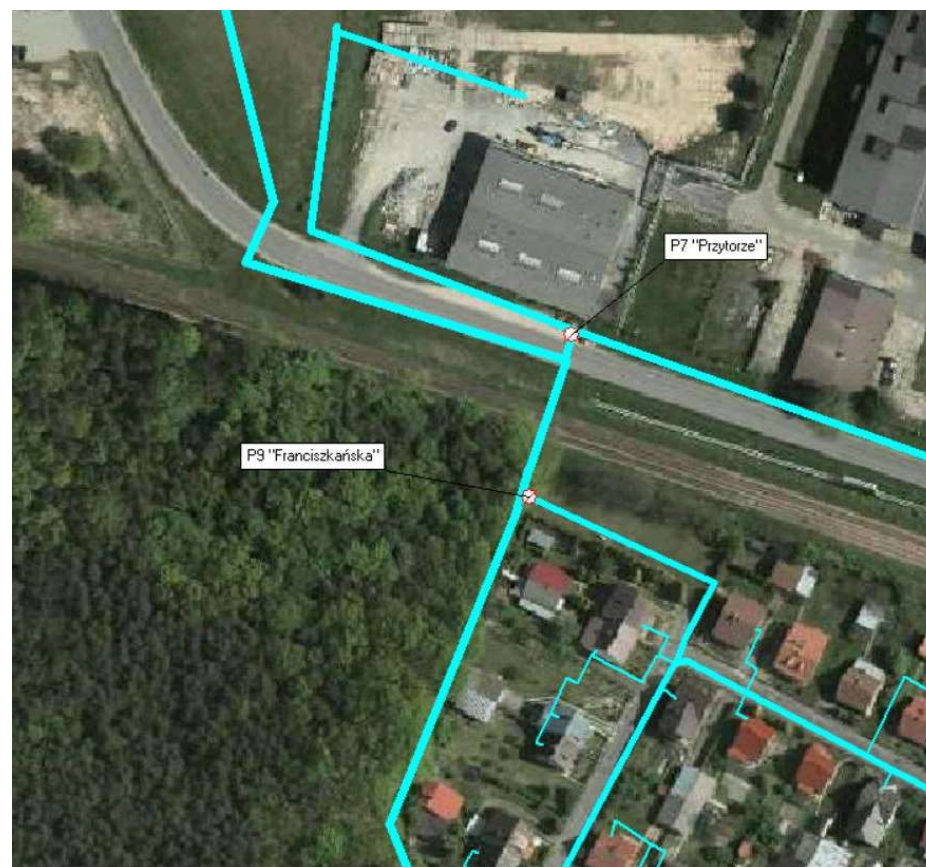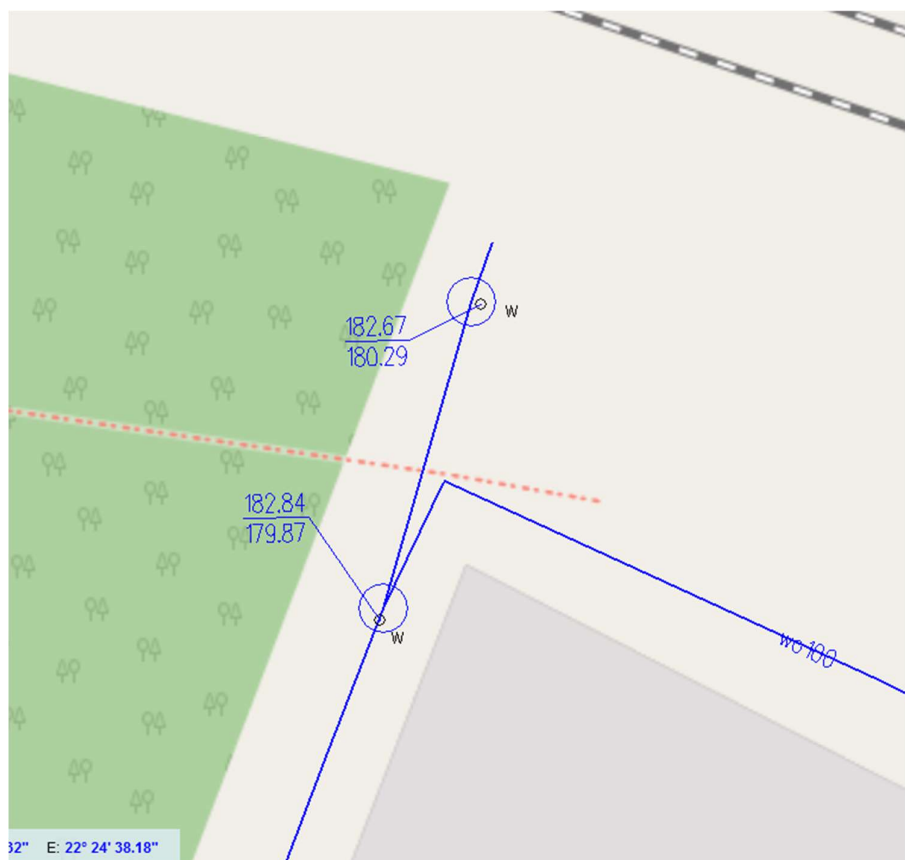


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P10	PROJEKTOWANY	III ► XV	Hutnicza	ul. Hutnicza 1	14/25 Id działki : 180801_1.0020.14/25	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Przy skrzyżowaniu ul. Przytorze z ul. Hutniczą i ul. 11 Listopada	

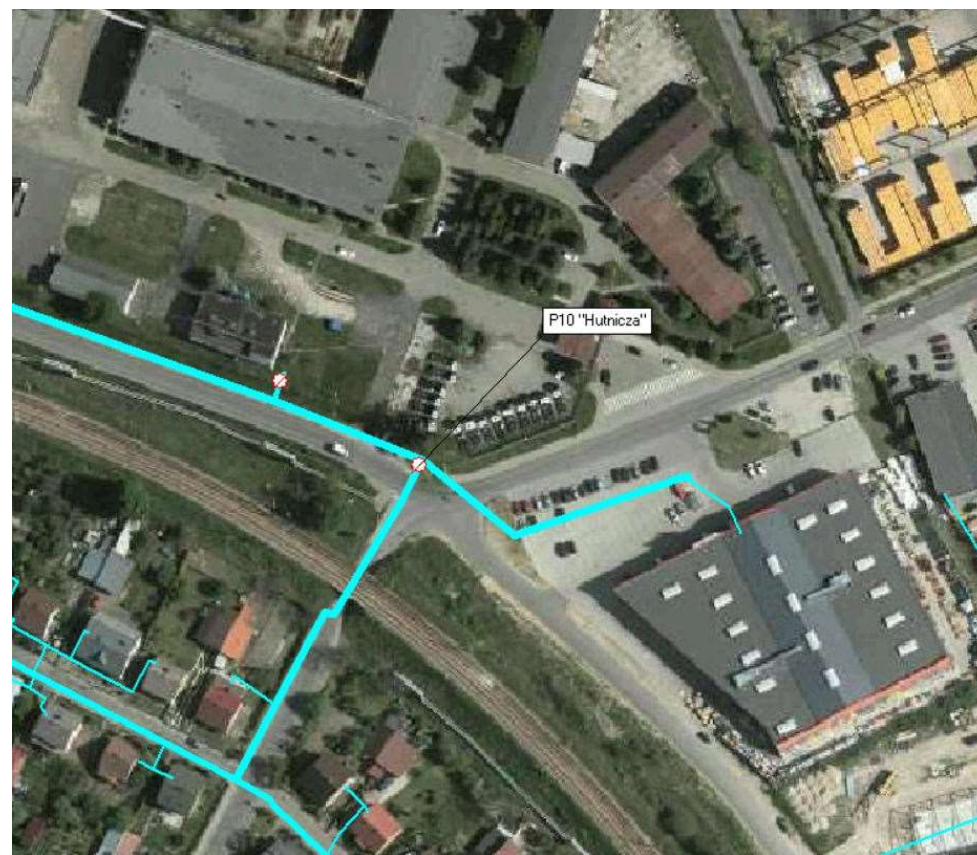


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P11	PROJEKTOWANY	I ► III	Popieluszki	ul. Nowińskiego 38	548/112 Id działki : 180801_1.0020.548/112	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Komora przy ul. Popieluszki	


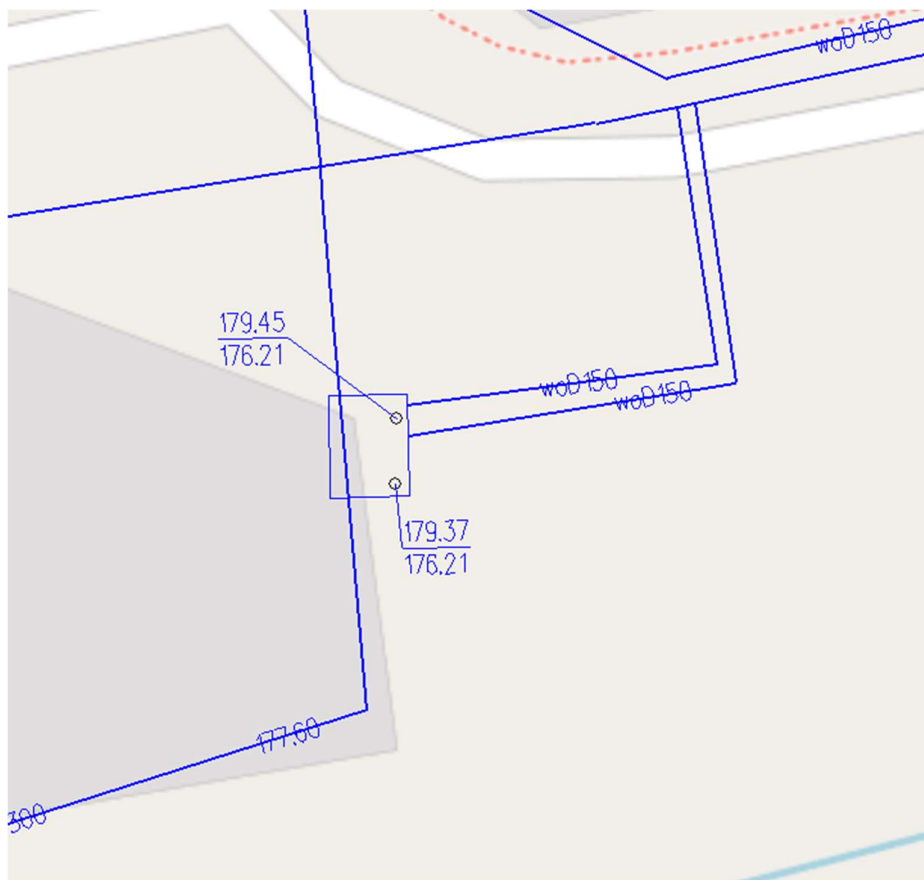


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P12	PROJEKTOWANY	III ► V	Broniewskiego	ul. Broniewskiego 6	550/1 Id działki : 180801_1.0020.550/1	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Broniewskiego/Popieluszki przy strumyku Jagódka	

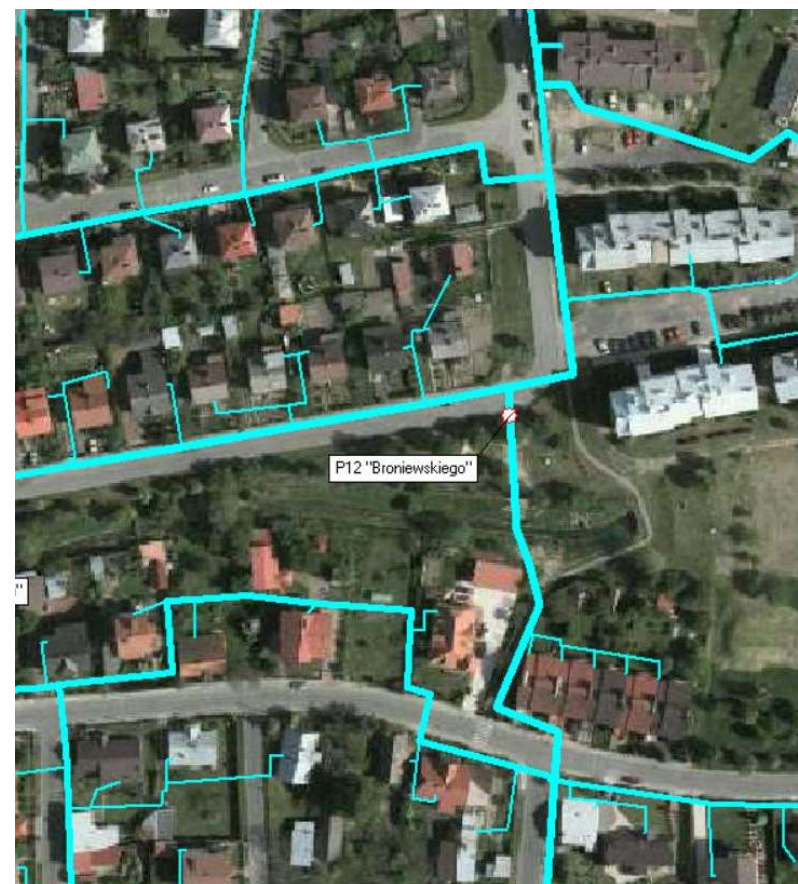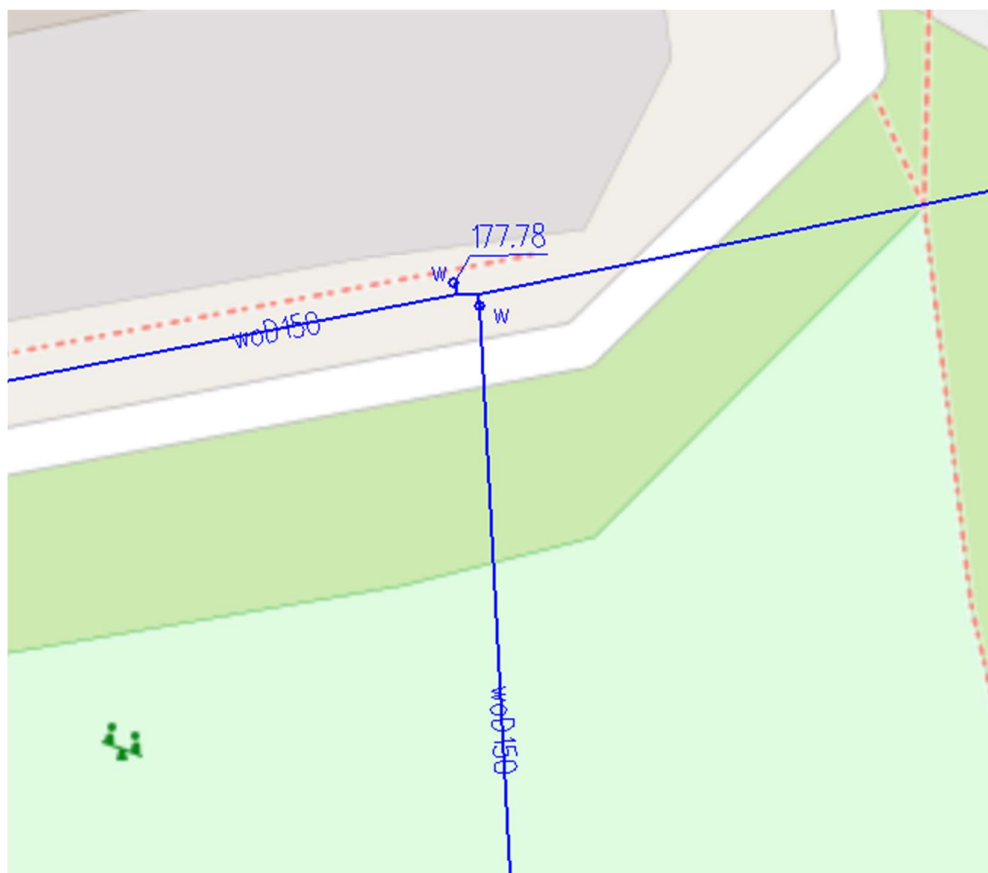


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P13	ISTNIEJĄCY	III ► IV	Klasztorna	ul. Klasztorna 14	6909/1 Id działki : 180801_1.0020.6909/1	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Istniejący pomiar komora redukcyjno pomiarowa	ul. Klasztorna	


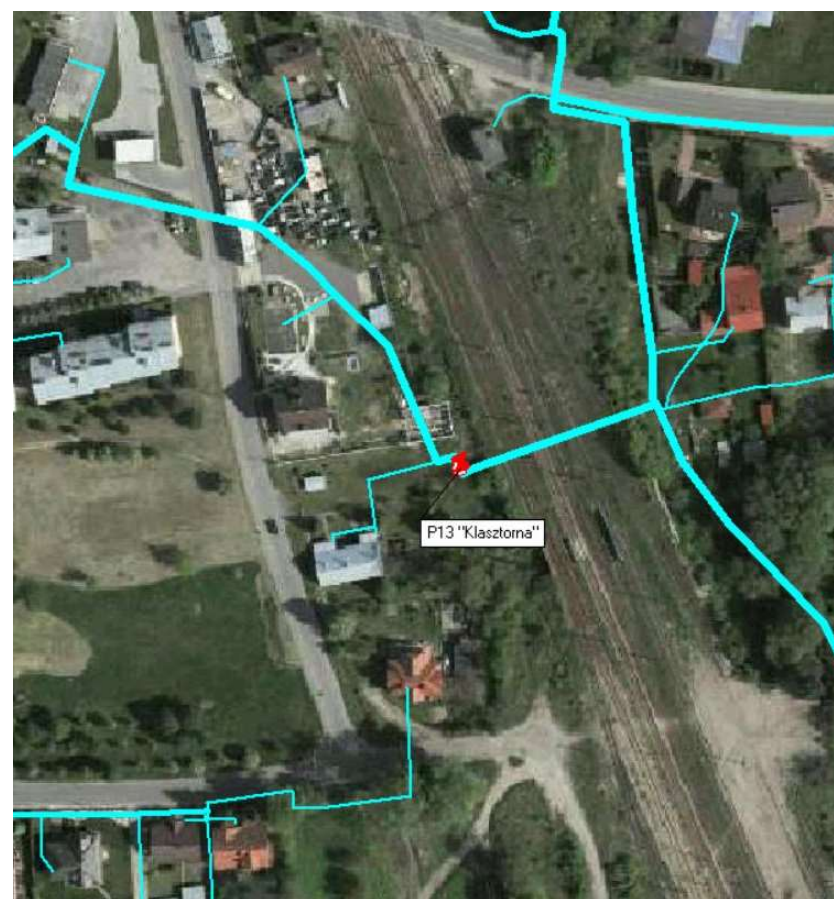


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P14	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► V	Mickiewicza 1	ul. Jana z Dukli 2	3599/2 Id działki : 180801_1.0020.3599/2	P i Q +/-	110

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Jana z Dukli/Konopnickiej, montaż na odcinku do ul. Mickiewicza	

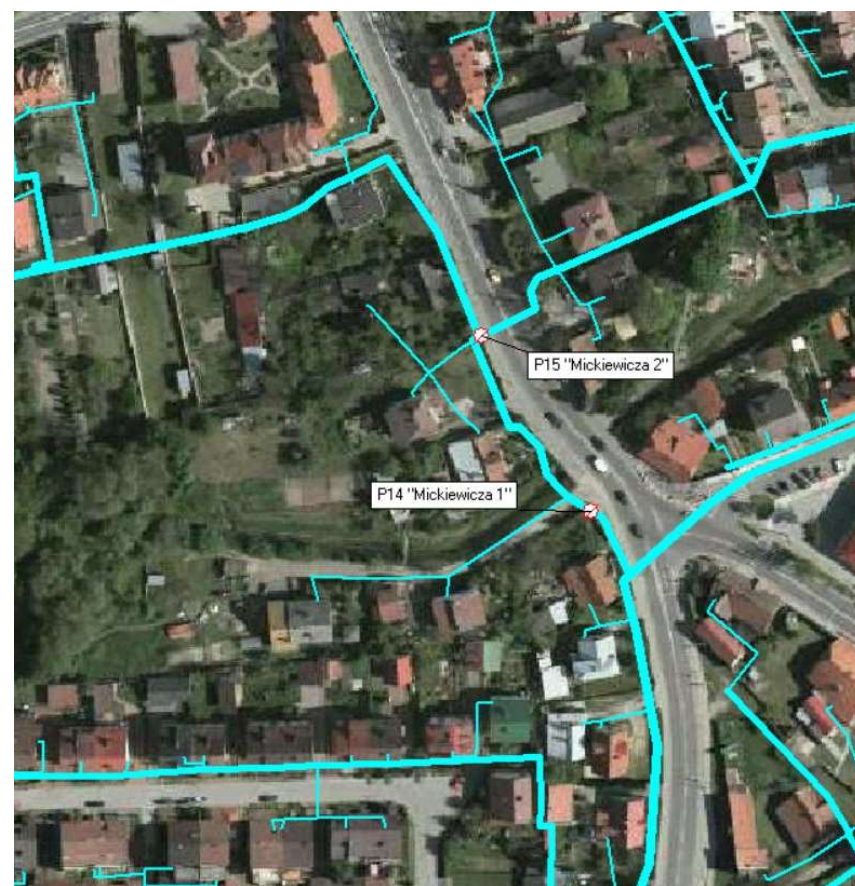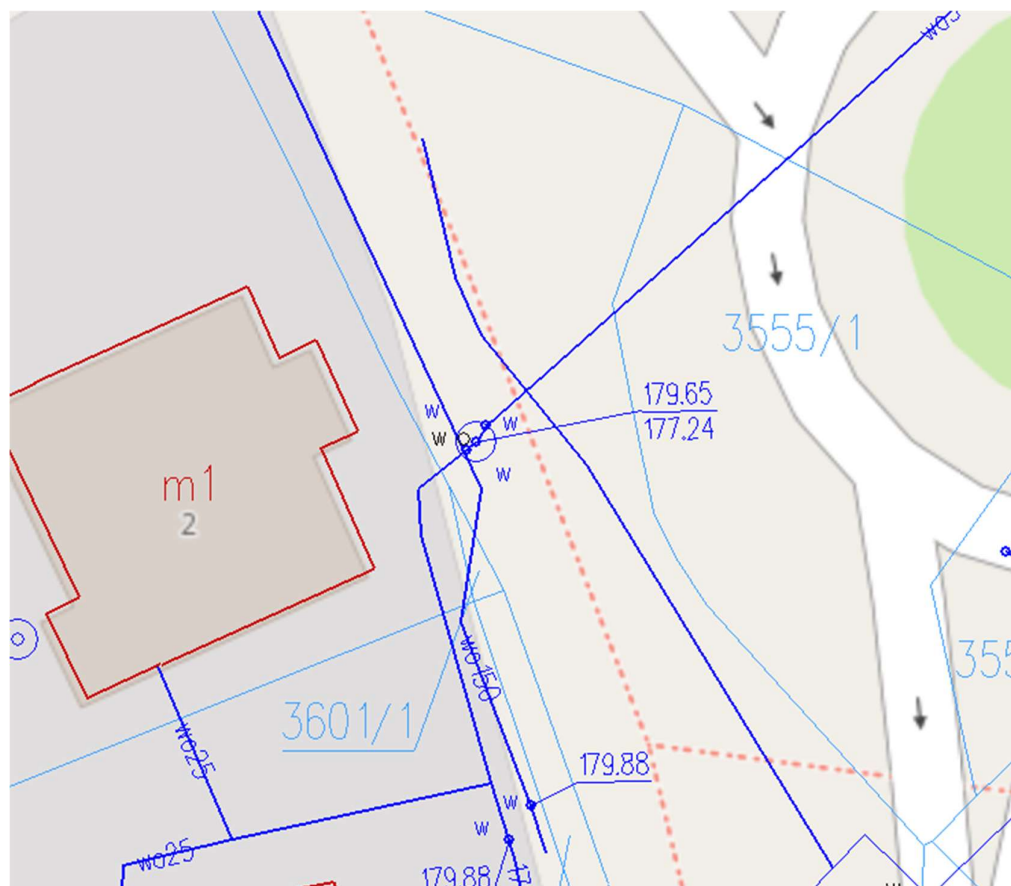


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P15	PROJEKTOWANY	II ► III	Mickiewicza 2	ul. Mickiewicza 125	3600/9 Id działki: 180801_1.0020.3600/9	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Mickiewicza przy strumyku Jagoda	

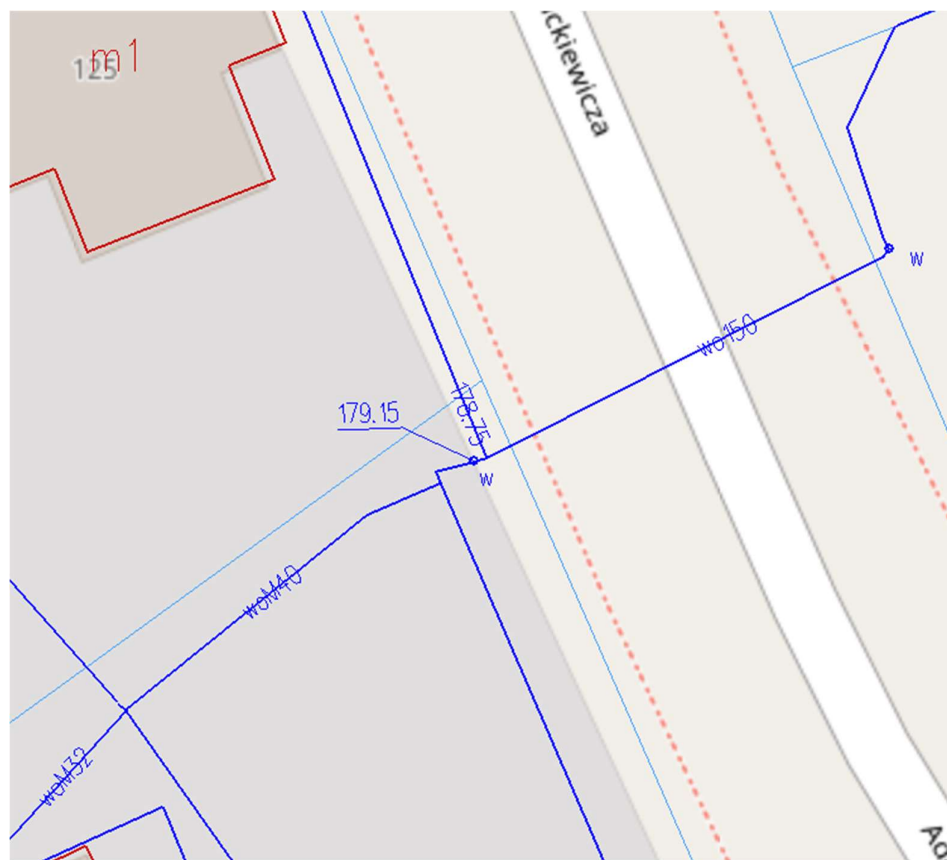


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P16	PROJEKTOWANY	I ▶ V	Jana z Dukli 1	ul. Jana z Dukli 10	3599/2 Id działki : 180801_1.0020.3599/2	P i Q +/-	110

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Komora przy ul. Jana z Dukli do Sanepid	

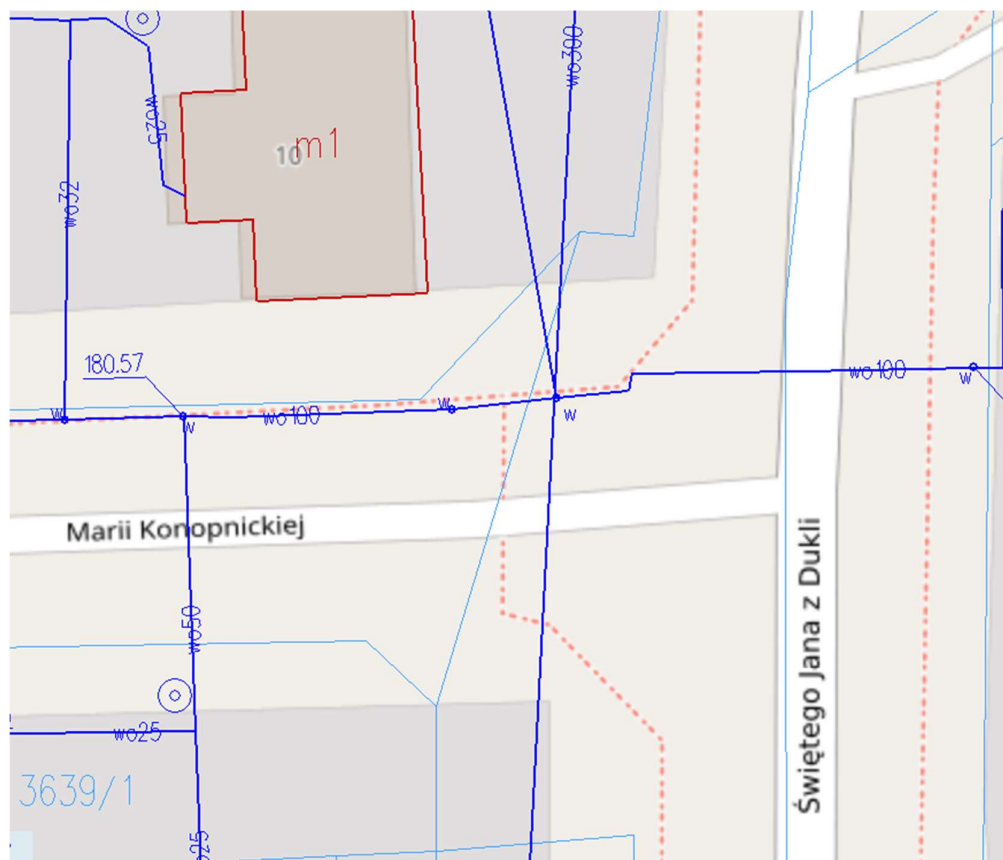


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P17	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► VI	Konopnickiej	ul. Jana z Dukli 10	3599/2 Id działki :180801_1.0020.3599/2	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Komora przy ul. Jana z Dukli	


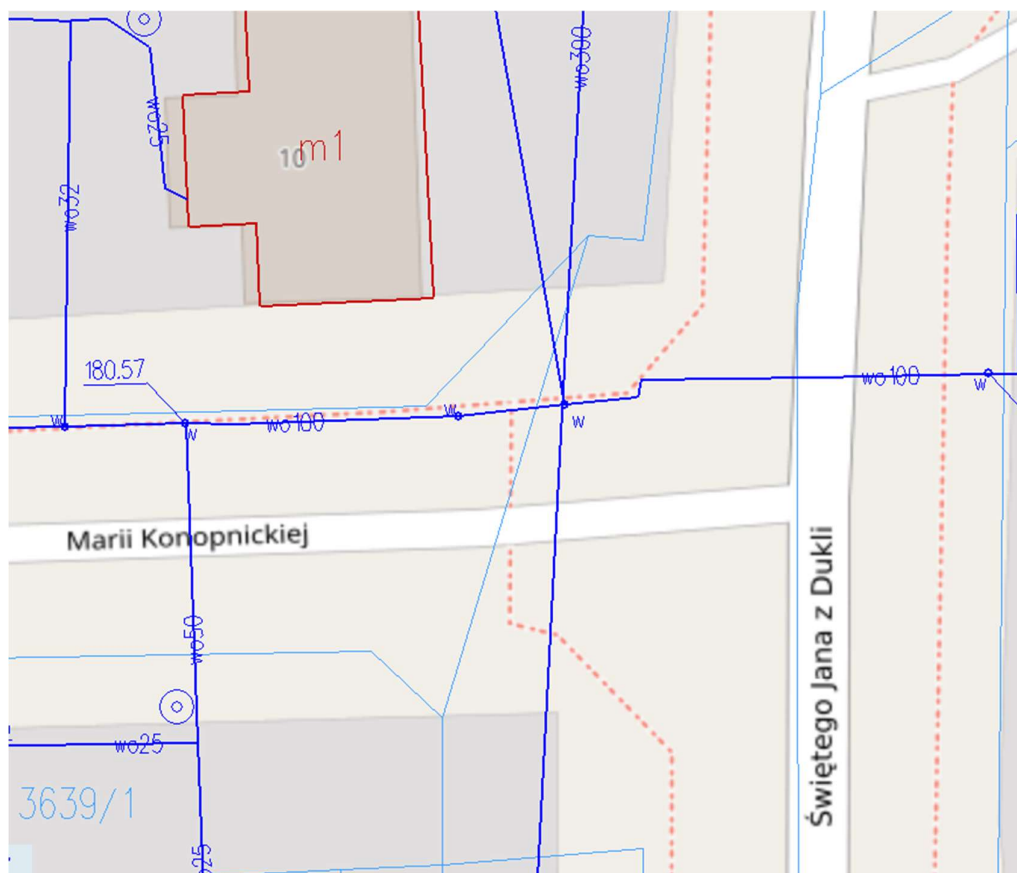


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P18	ISTNIEJĄCY	VIII ► XII	28. Maja 1	ul. 28 Maja	1040/8 Id działki : 180801_1.0020.1040/8	P i Q +/-	100

Komentarz	Opis	Uwagi
Istniejący pomiar przepływu i ciśnienia, reduktor	W chodniku na ul. 28 Maja	

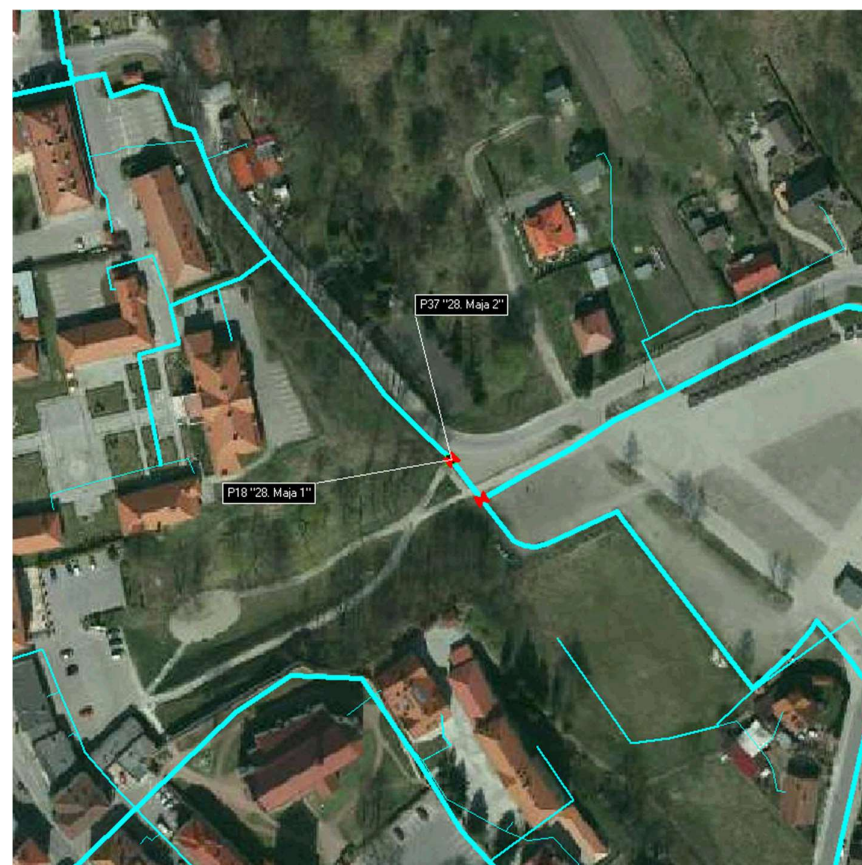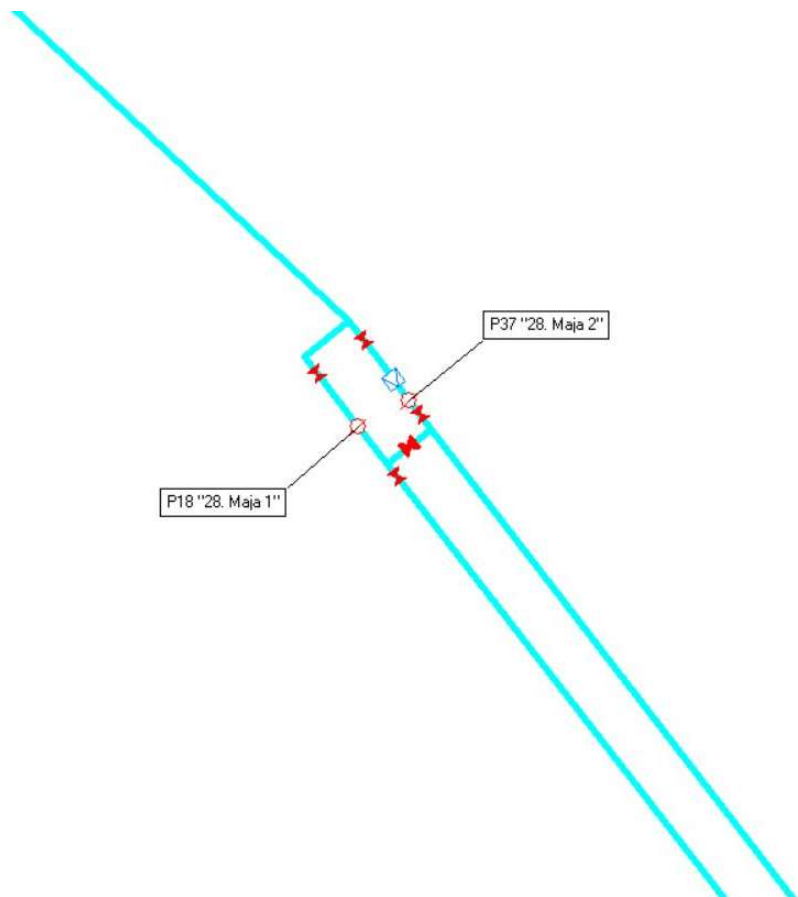


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P19	PROJEKTOWANY	VI ▶ XVI	Iwaskiewiczza	ul. Iwaskiewiczza 14	6029/2 Id działki : 180801_1.0020.6029/2	P i Q +/-	110

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Komora przy ul. Iwaskiewiczza	


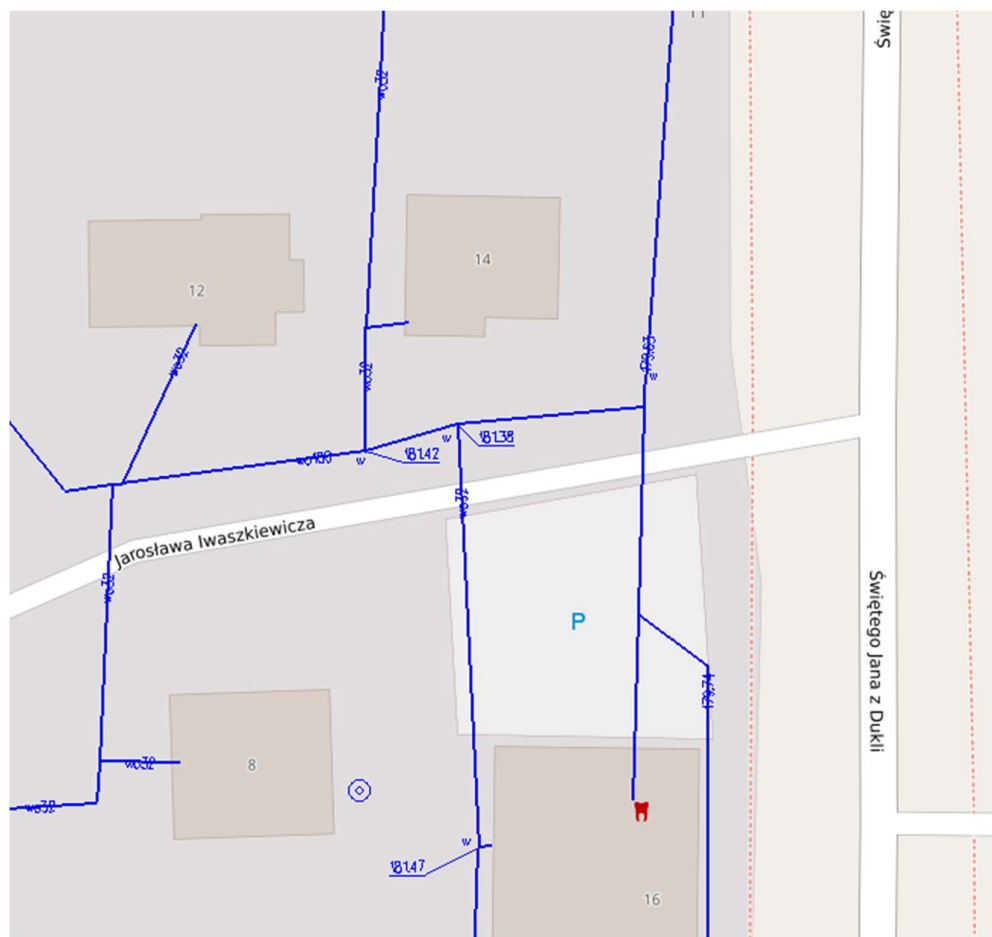


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P20	PROJEKTOWANY	V ► IX	Chrobrego	ul. Skłodowskiej 4c	4192/8 Id działki : 180801_1.0020.4192/8	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Przy LICEUM, chodnik, skrzyżowanie ulic: Skłodowskiej i Chrobrego	

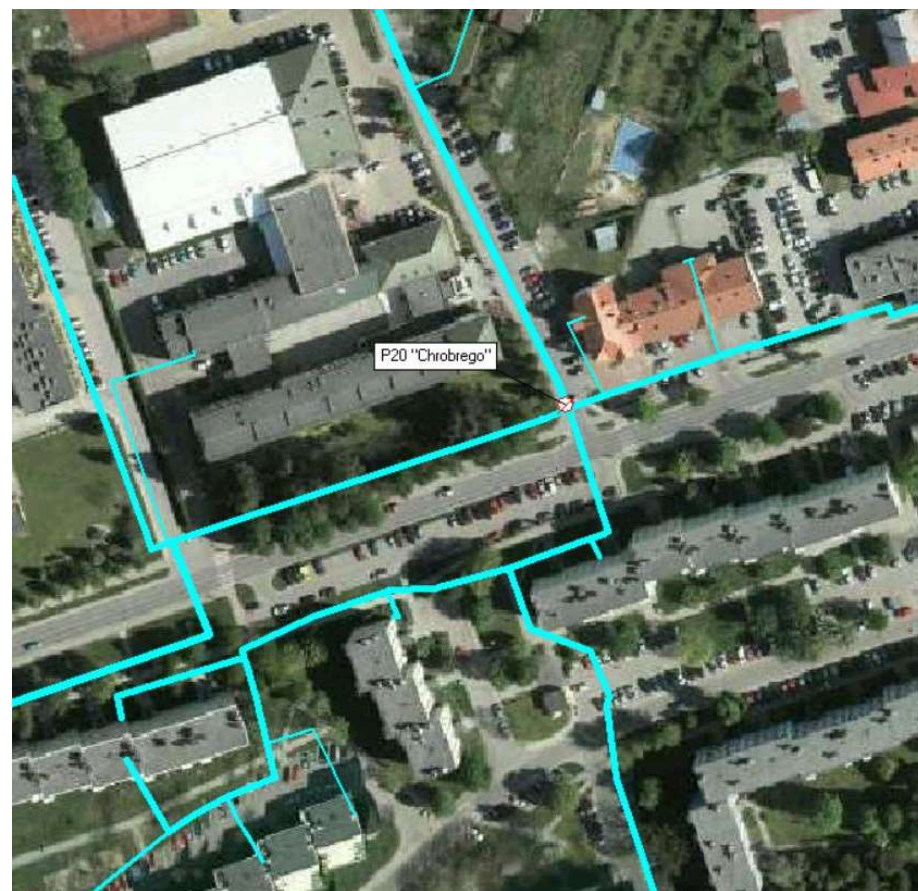
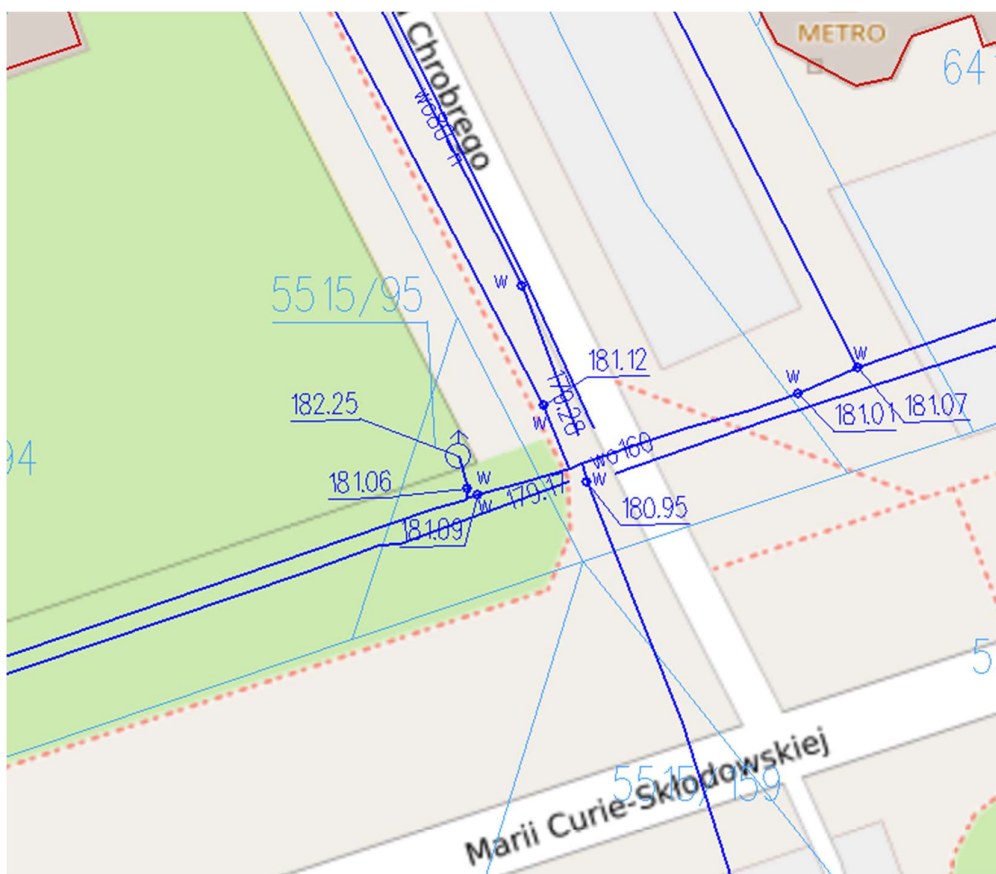


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P21	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► XIII	Cmentarz	Cmentarz	4992/14 Id działki : 180801_1.0020.4992/14	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	przy ogrodzeniu Cmentarza Miejskiego	

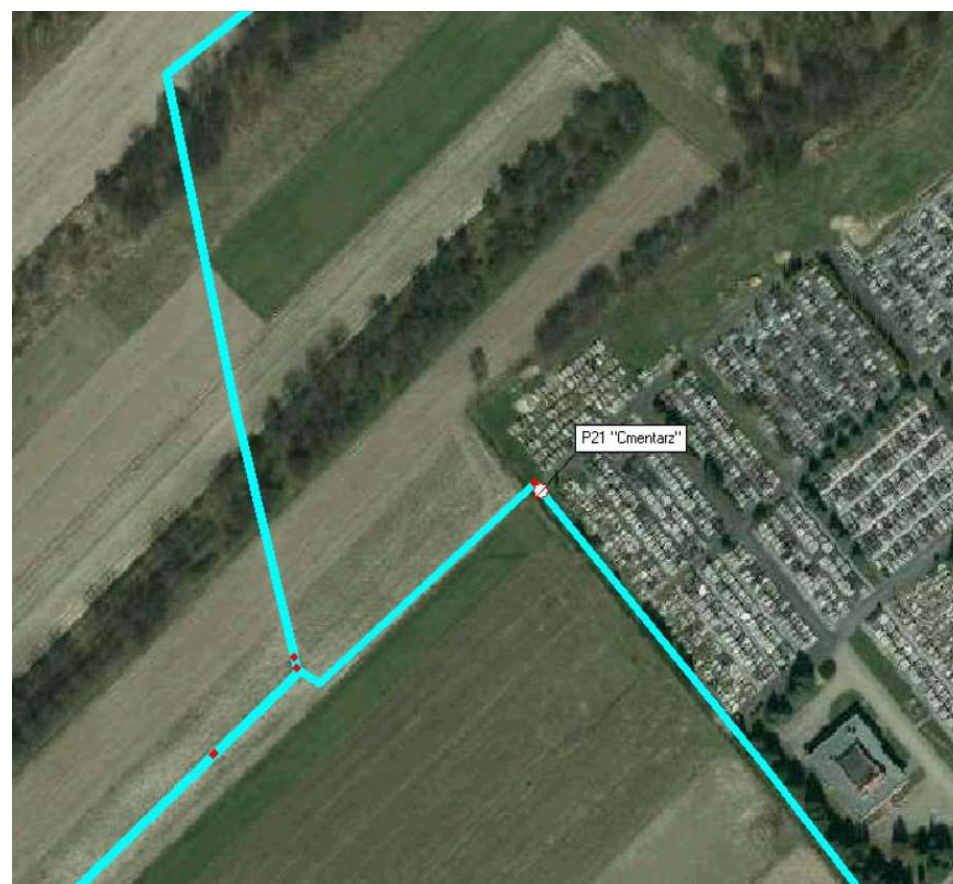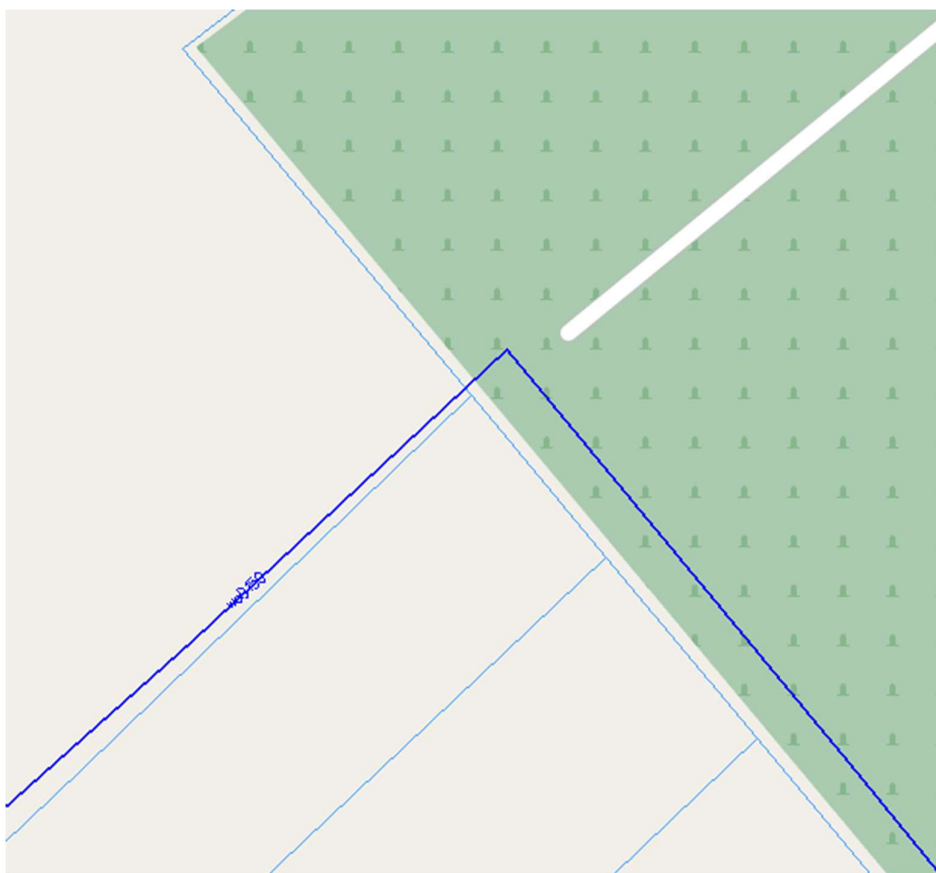


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P22	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► VI	Kochanowskiego	ul. Kochanowskiego 1	6029/4 Id działki : 180801 1.0020.6029/4	P i Q +/-	110

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Komora przy ul. Jana z Dukli	

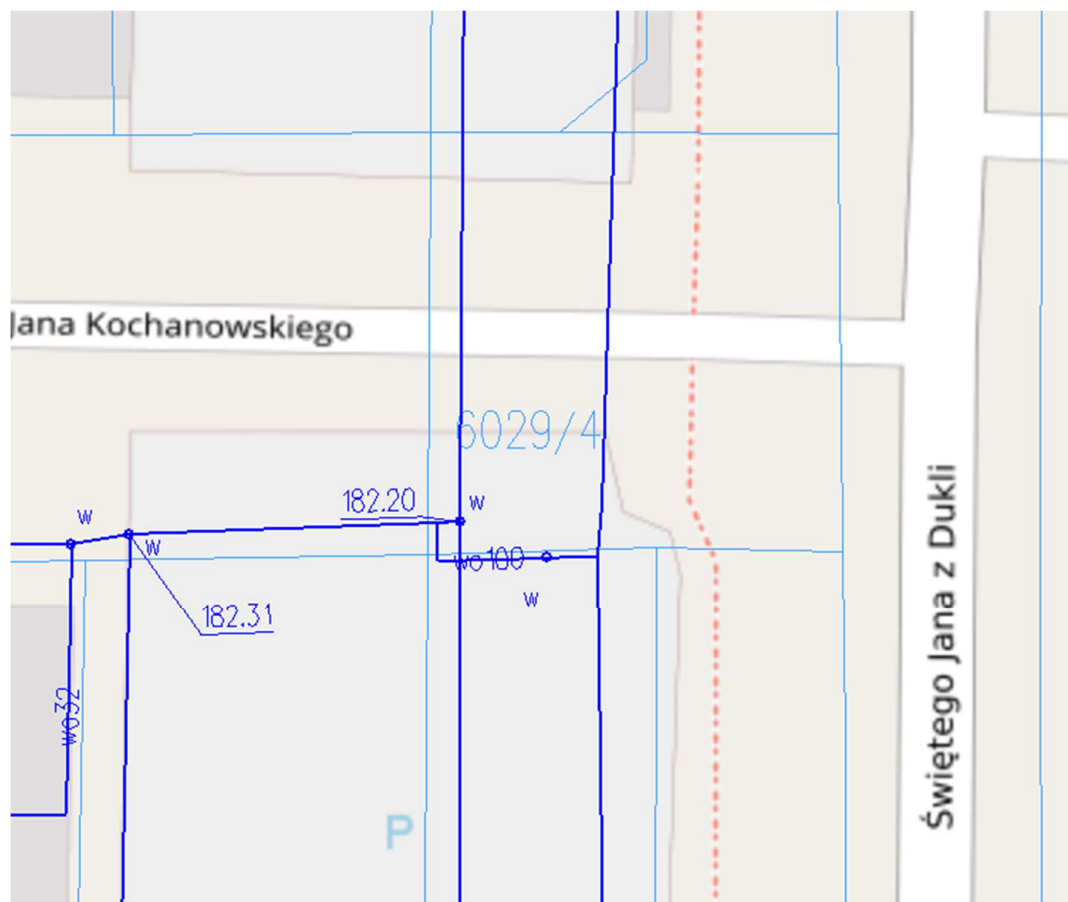


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P23	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ▶ VI	Jana z Dukli 2	ul. Opalińskiego 40	6029/9 Id działki : 180801 1.0020.6029/9	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Komora przy ul. Jana z Dukli	

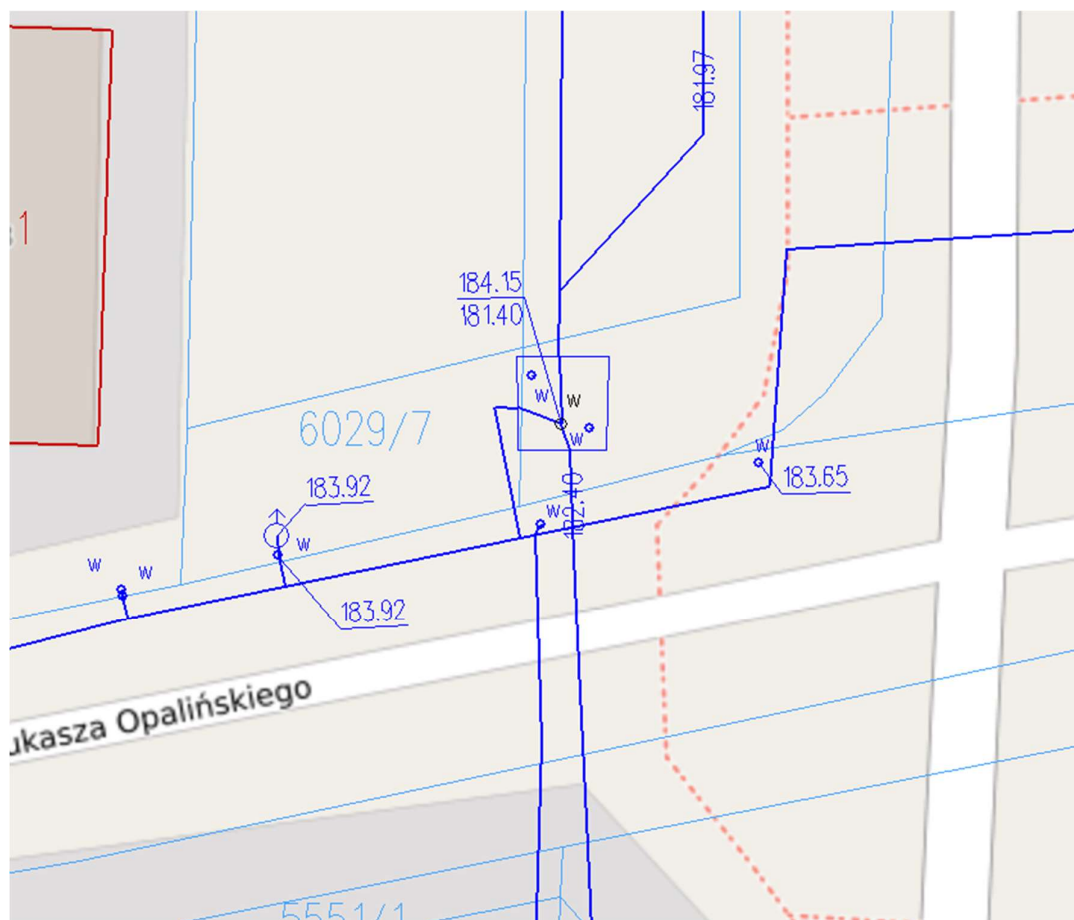


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P24	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ▶ V	Jana z Dukli 3	ul. Opalińskiego 40	6029/9 Id działki : 180801 1.0020.6029/9	P i Q +/-	

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	Komora przy ul. Jana z Dukli	


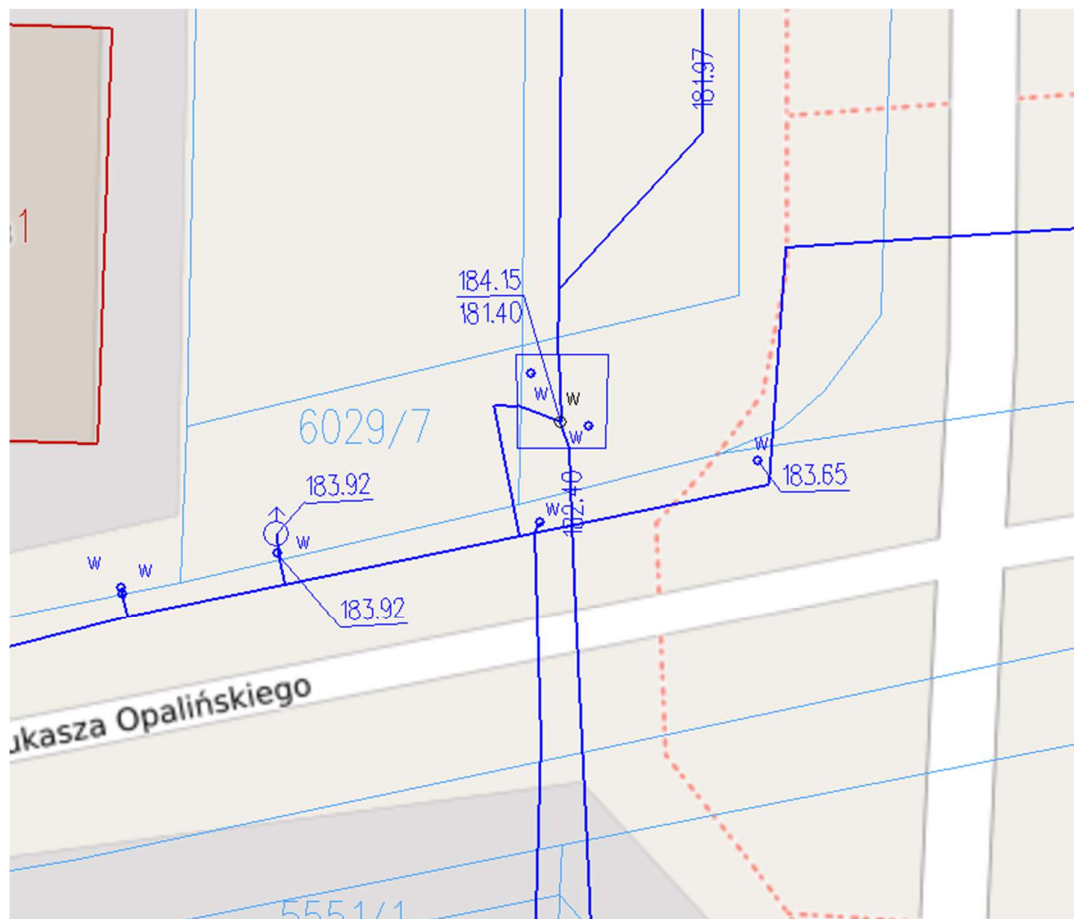


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P25	PROJEKTOWANY	II ► VI	Kąty	ul. Kąty 12	3849/12 Id działki : 180801_1.0020.3849/12	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Kąty przy hydrancie	

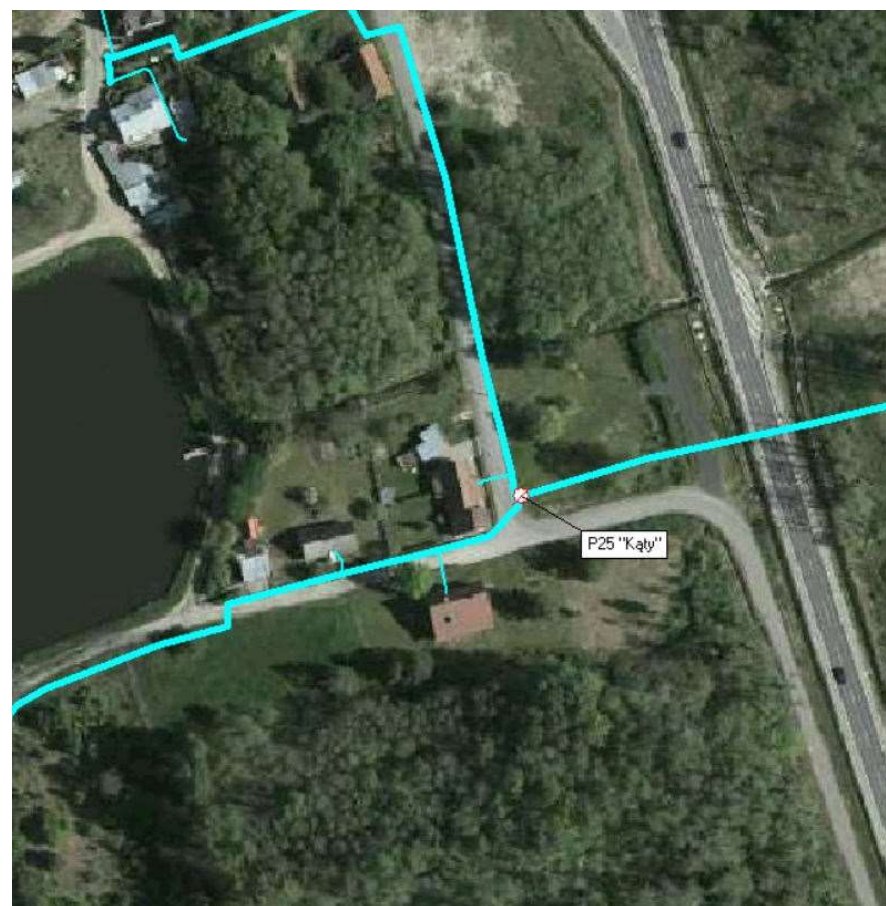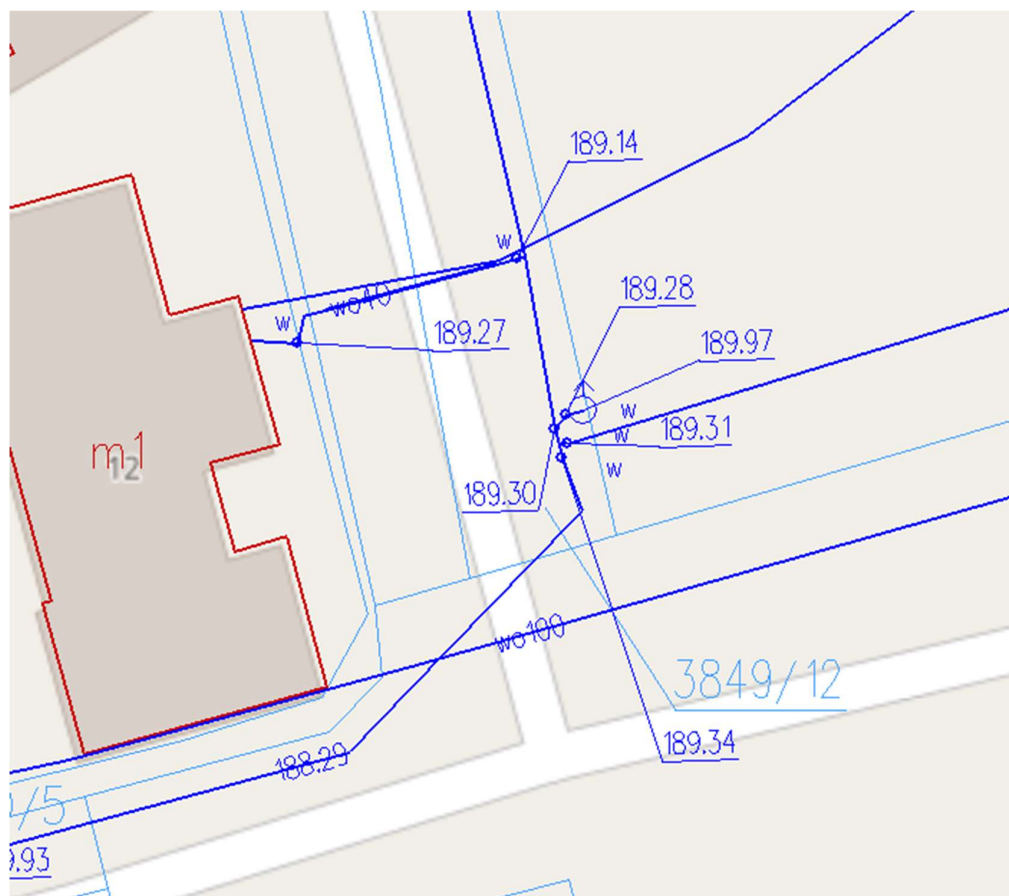

ZAŁĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P26	PROJEKTOWANY	IV ► VII	Podolszyny	ul. Podolszyny 104	2681/74 Id działki : 180801_1.0020.2681/74	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Podolszyny przy rowku, przed trójnikiem	




ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P27	PROJEKTOWANY	X ► XI	Zawilskich	ul. Zawilskich 41	2836 Id działki : 180801_1.0020.2836	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Burmistrzów Zawilskich, przed zasuwą od strony torów	

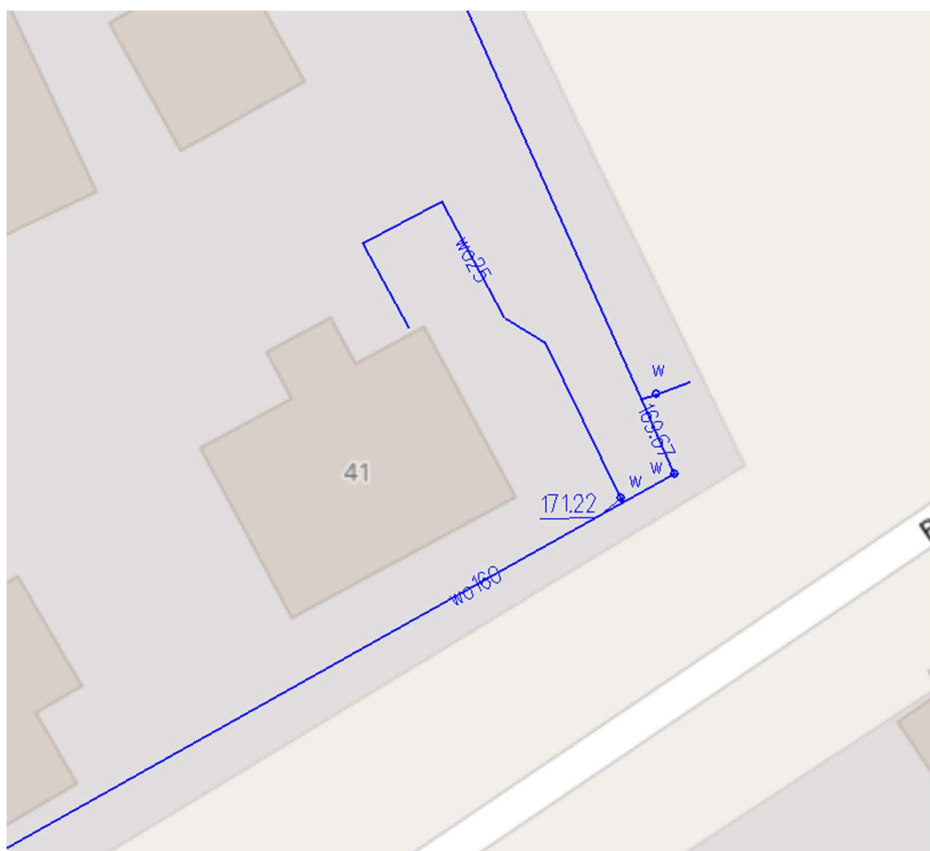


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P28	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► IX	Jagiełły	ul. Sandomierska 64	6457/5 Id działki : 180801_1.0020.6457/5	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Sandomierska	

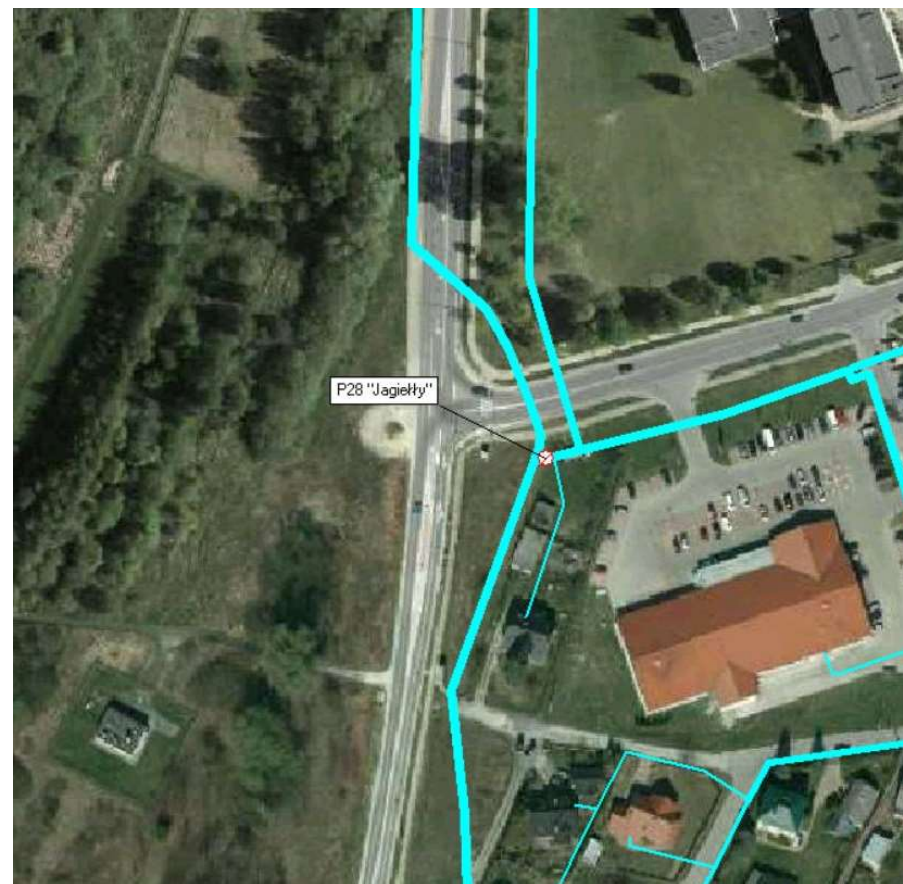


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P29	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► IX	Konwaliowa	ul. Lawendowa	4305/5 Id działki : 180801_1.0020.4305/5	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Ogrodowa/ Konwaliowa	


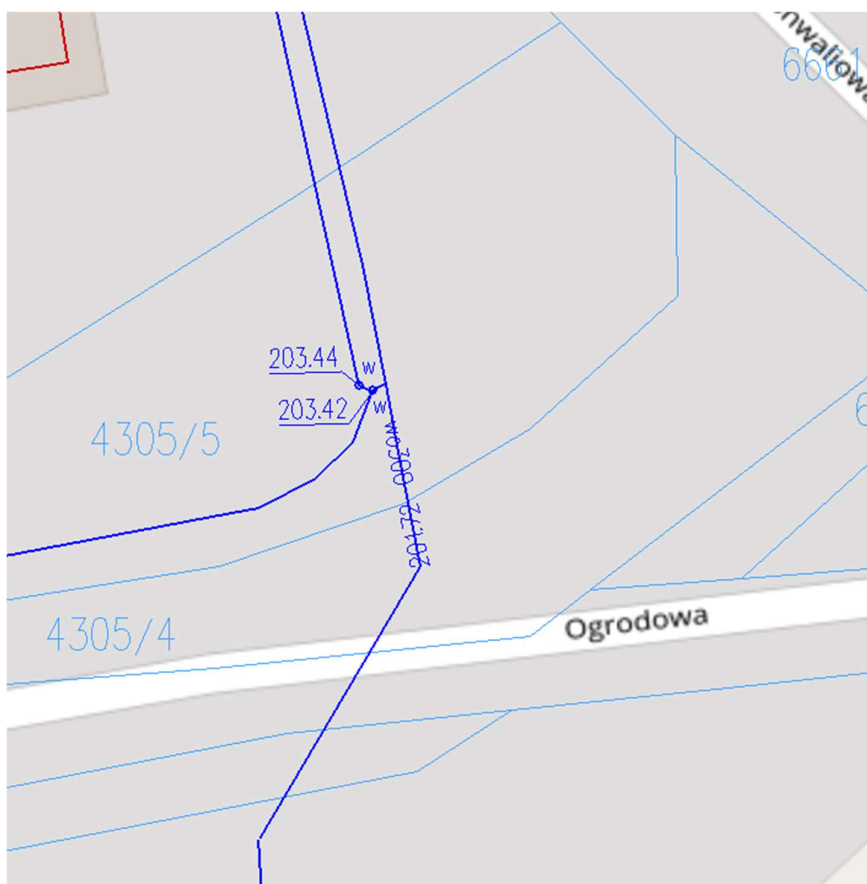


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P30	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► IX	Lawendowa	ul. Lawendowa 2	4968/4 Id działki : 180801_1.0020.4968/4	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	ul. Lawendowa	

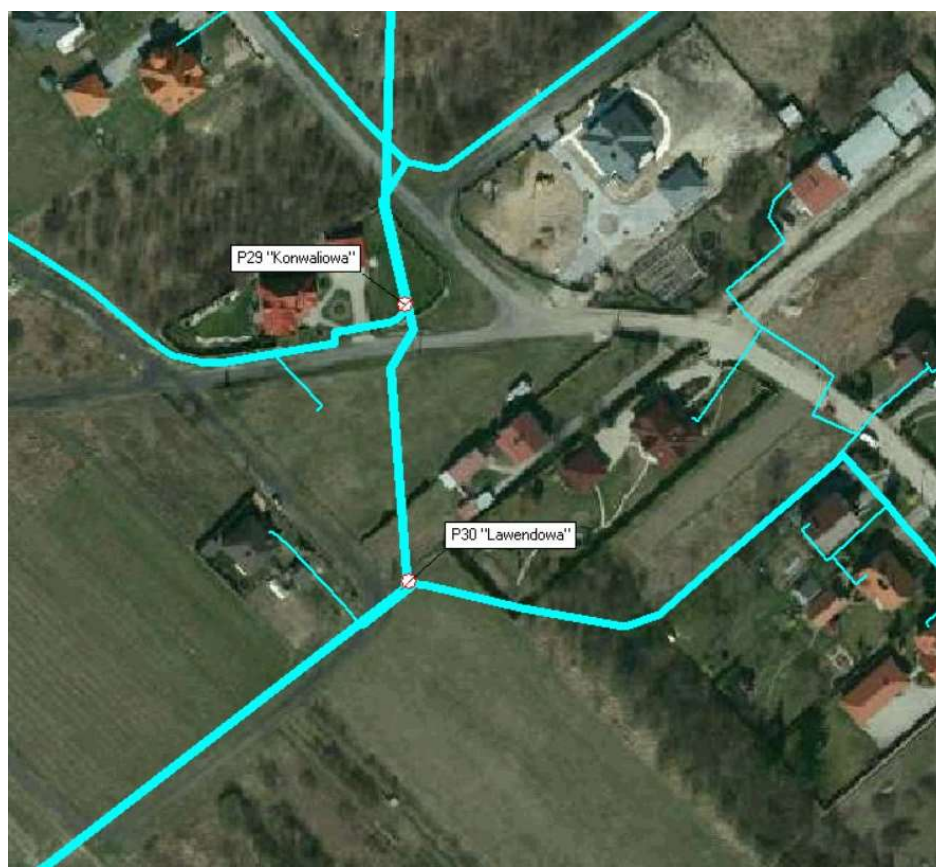
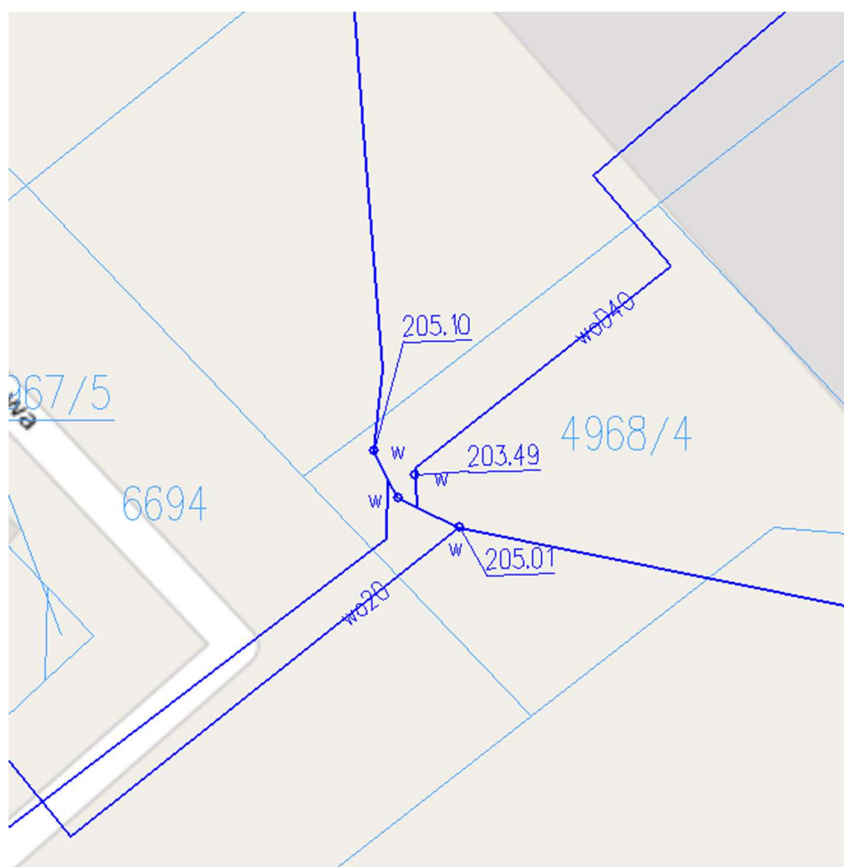


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P31	PROJEKTOWANY	I (magistrala) ► ZBIORNIK	Zbiornik	Zbiornik wyrównawczy	1013/1 Id działki : 180804_2.0021.1013/1	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż rejestratora, wykorzystanie istniejącego przepływomierza do rejestracji przepływów	Komora zasuw w zbiorniku wyrównawczym	

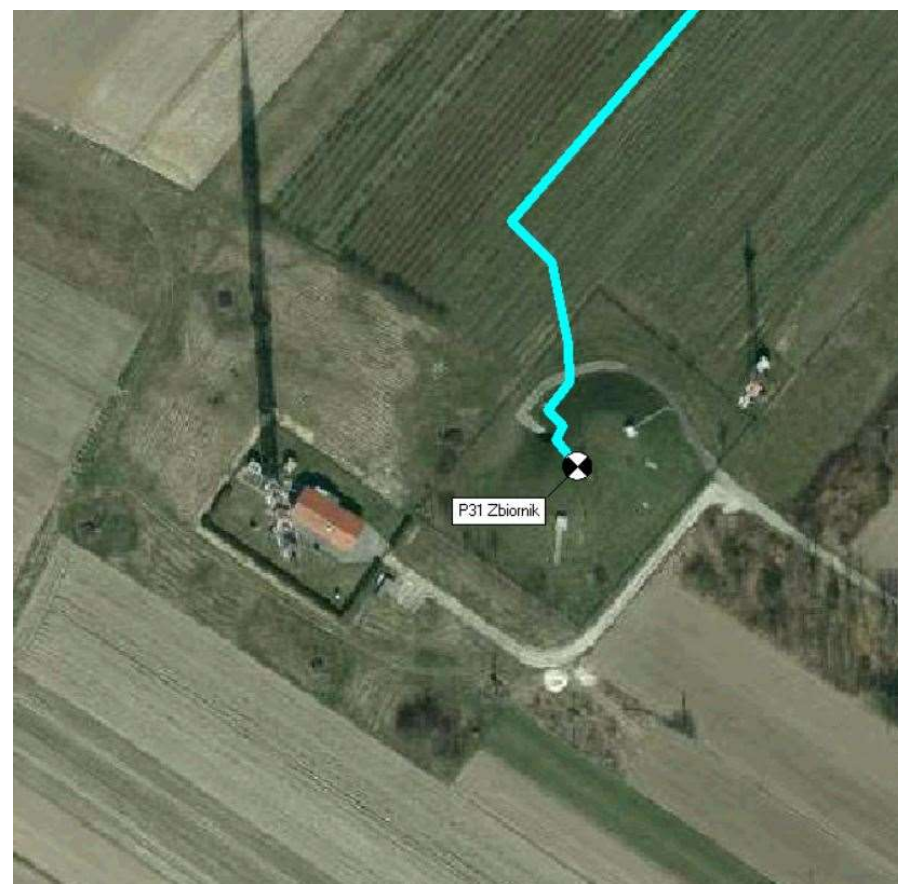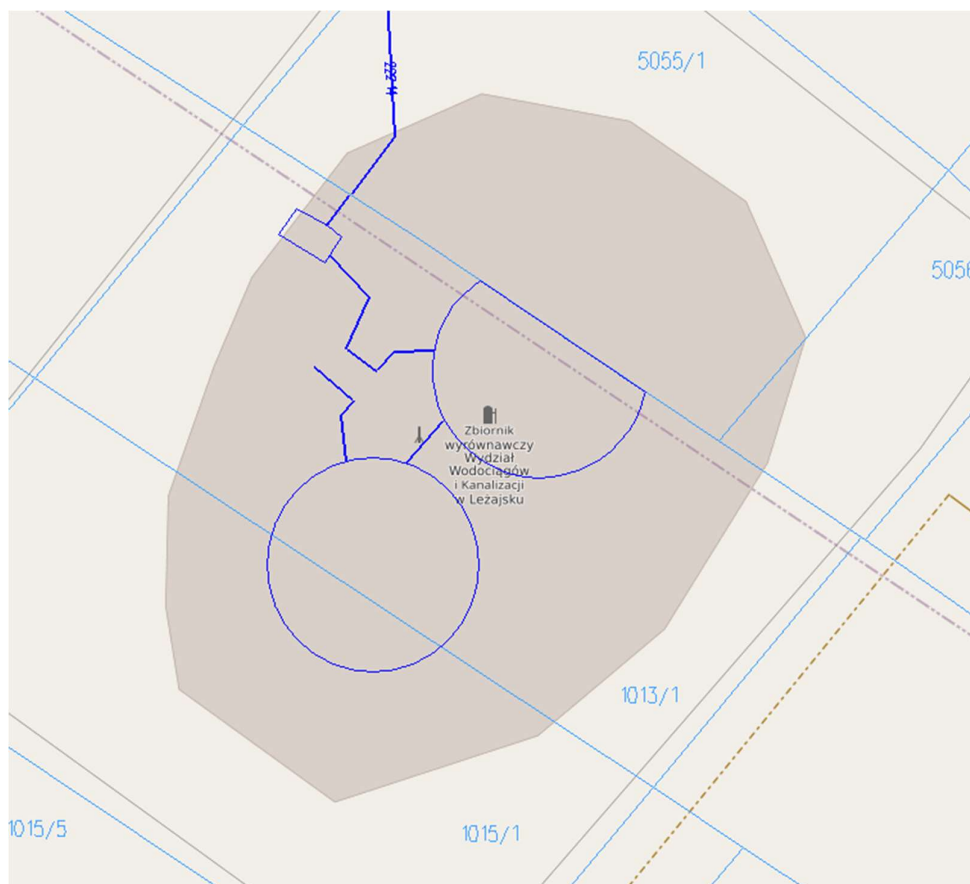


ZAŁĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P32	PROJEKTOWANY	IX ► XII	Jaszowskiego	pl. Jaszowskiego	4387/2 Id działki : 180801_1.0020.4387/2	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Montaż przepływomierza i rejestratora	pl. Jaszowskiego teren zielony	

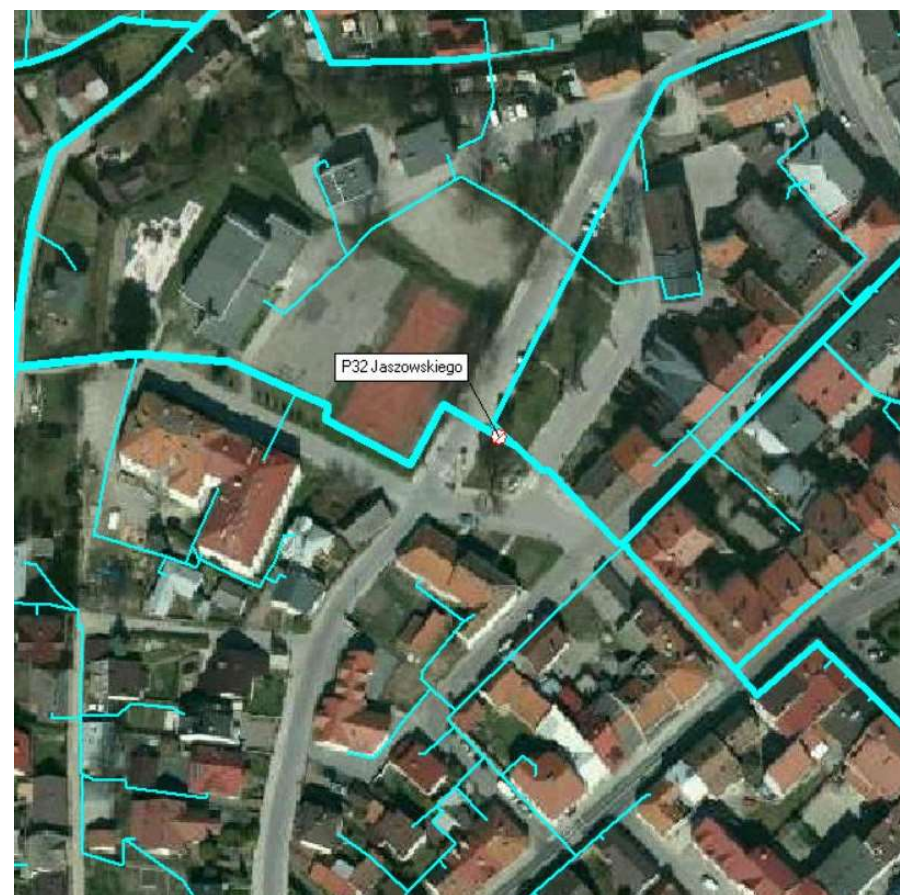


ZAŁĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P33	ISTNIEJĄCY	VII ► X	Baza	ul. Podolszyny (Baza)	2681/4 Id działki : 180801_1.0020.2681/4	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Istniejący pomiar przepływu i ciśnienia	ul. Podolszyny	

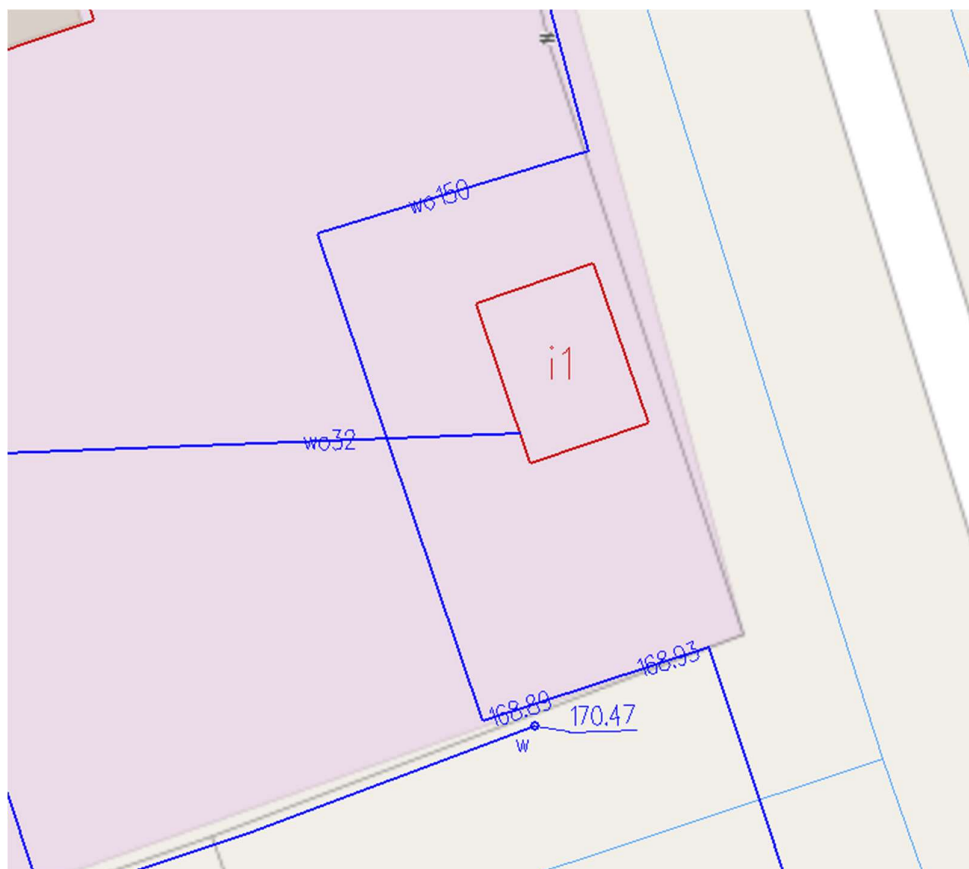


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P34	ISTNIEJĄCY	X ► XIV	Podzwierzyniec	ul. Podzwierzyniec	3202/1 Id działki : 180801_1.0020.3202/1	P i Q +/-	80

Komentarz	Opis	Uwagi
Istniejący pomiar komora redukcyjno pomiarowa	ul. Podzwierzyniec	

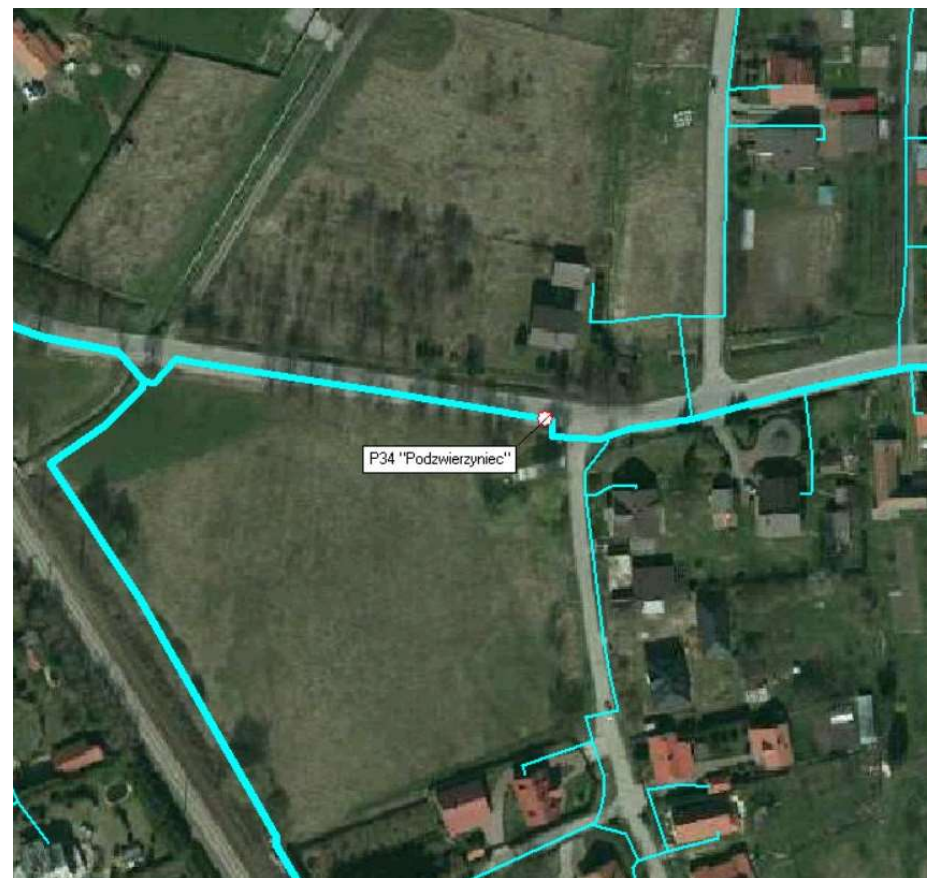


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P35	ISTNIEJĄCY	XI ► XIII	Moniuszki	ul. Boczna Moniuszki (hydrofornia)	1 Id działki : 180801_1.0020.1	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Istniejący pomiar komora redukcyjno pomiarowa	ul. Moniuszki/Szymanowskiego	


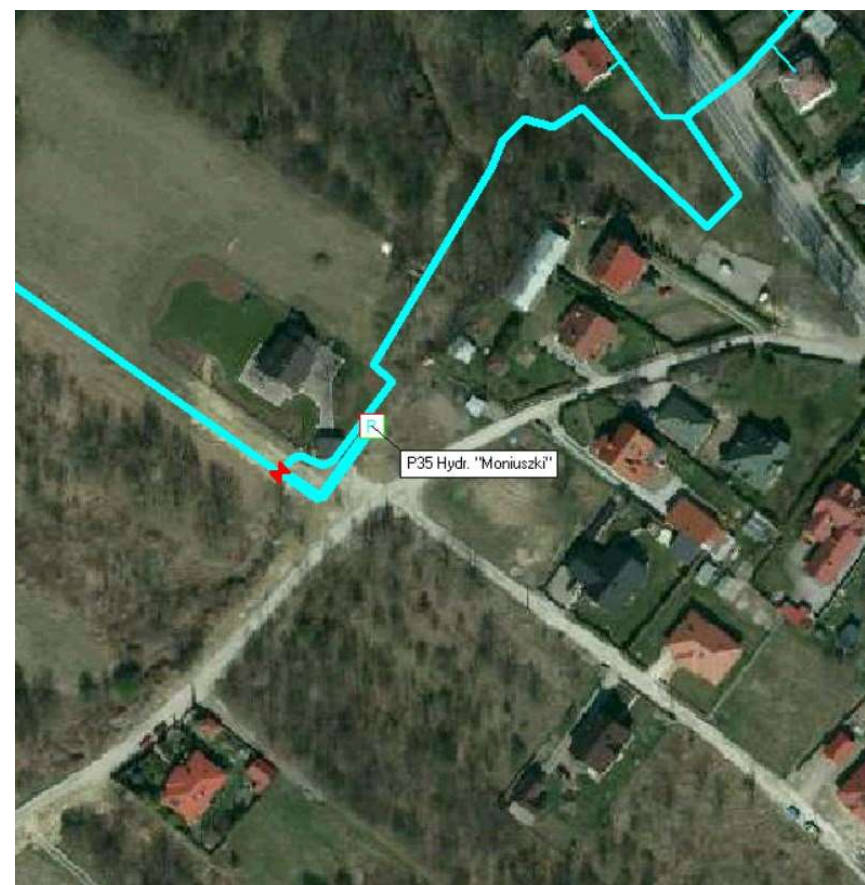


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P36	ISTNIEJĄCY	VIII ► IX	ZUS	ul. Mickiewicza 24	1030/2 Id działki : 180801_1.0020.1030/2	P i Q +/-	100

Komentarz	Opis	Uwagi
Istniejący pomiar przepływu i ciśnienia	Chodnik ul. Mickiewicza / 28-maja	

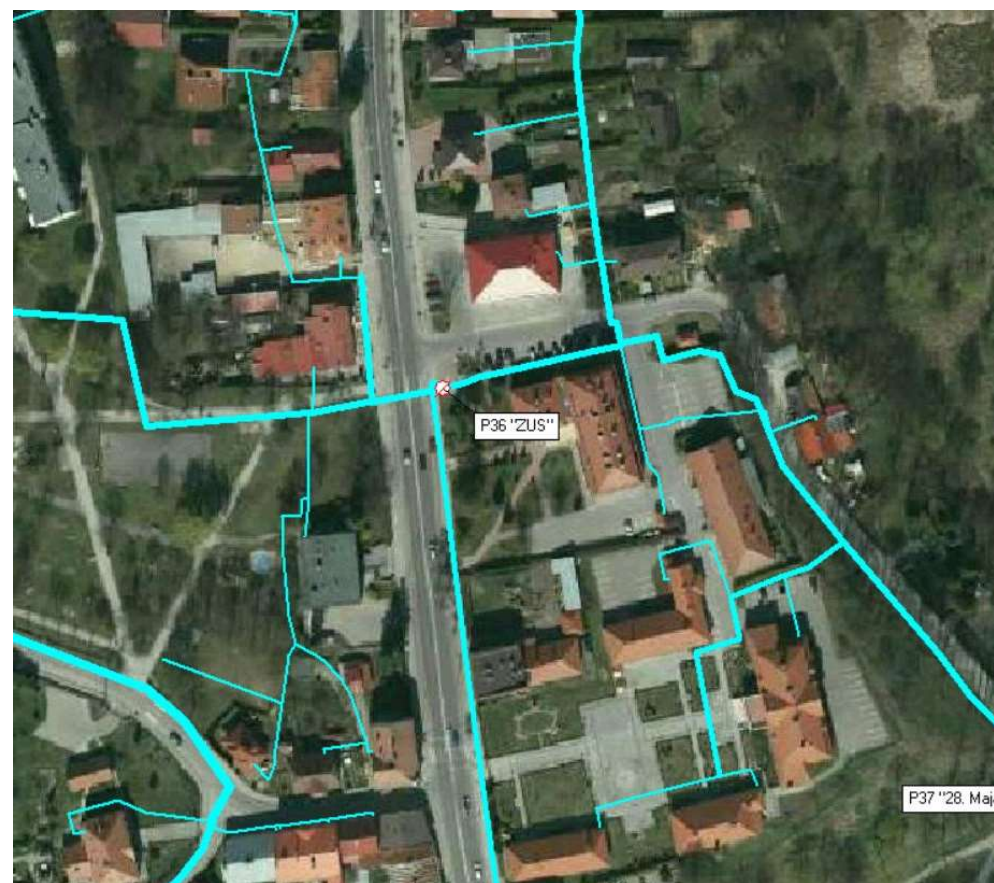
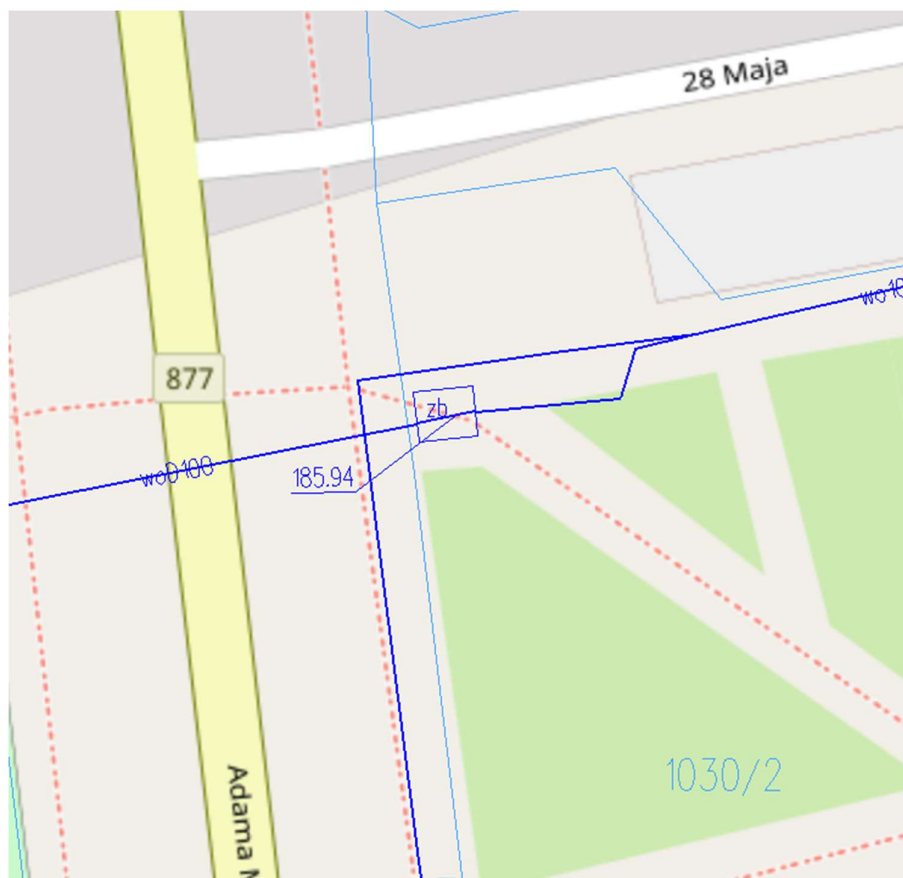


ZALĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK

ID	Status	Strefa	Nazwa (robocza)	Lokalizacja	Teren	Pomiar	DN rury
P37	ISTNIEJĄCY	VIII ► XI	28 Maja 2	ul. 28 Maja	1032/12 Id działki : 180801 1.0020.1032/12	P i Q +/-	150

Komentarz	Opis	Uwagi
Istniejący pomiar przepływu i ciśnienia, reduktor	Chodnik ul. Mickiewicza / 28-maja	

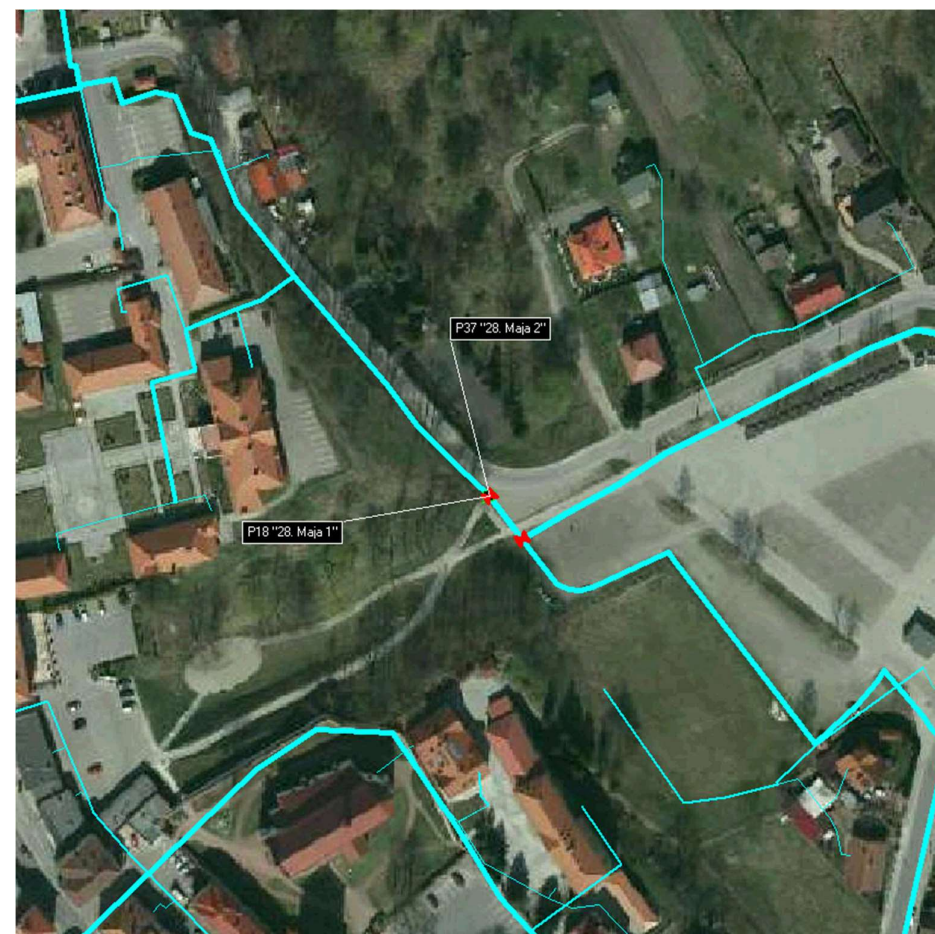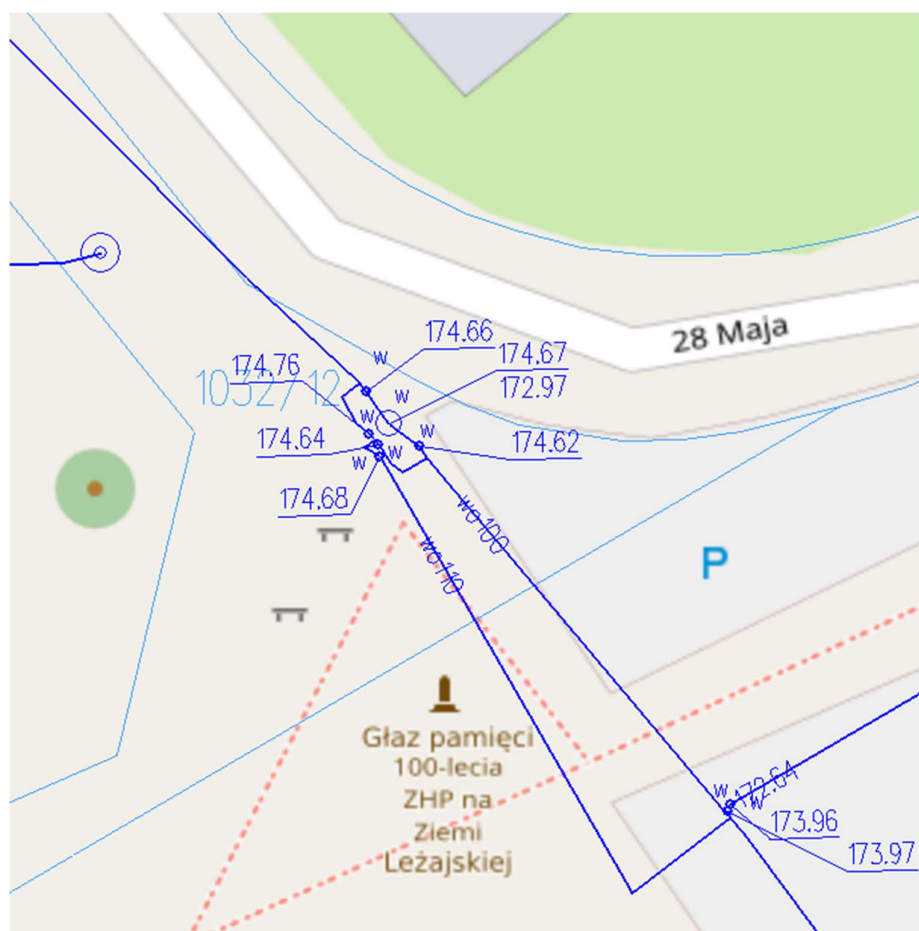

ZAŁĄCZNIK nr 2 Metryki punktów monitoringu sieci wodociągowej m. LEŻAJSK

Nazwa projektu: „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. LEŻAJSK
