

ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
Dział Elektroenergetyczny

Bydgoszcz 08.03.2021

PROTOKÓŁ NR 33/TE/2021

z przeprowadzonej kontroli i pomiarów instalacji odgromowej według normy PN-HD-60364

Zleceniodawca: REJON EKSPLOATACJI I KONTROLI SIECI S-2

Obiekt, miejsce kontroli: ul. Herberta 5 w Bydgoszczy

Data kontroli: 05.03.2021

Termin następnej kontroli w 2022 roku oraz natychmiast po bezpośrednim uderzeniu pioruna lub uszkodzeniu mechanicznym.

OPIS

1. Rodzaj budynku:	murowany
2. Pokrycie dachu:	papa
3. Otoczenie budynku:	budynki mieszkalne
4. Rodzaj gleby w okóło budynku:	piasek
5. Przeznaczenie budynku:	administracyjno - warsztatowy

WYNIKI KONTROLI

6. Pogoda w dniu pomiarów:	słonecznie
7. Stan zwodów głównych:	zły
8. Stan zwodów odprowadzających:	zły
9. Stan przewodów uziemiających:	dobry
10. Stan uziomów:	dobry
11. Kontrola:	pełna

Zalecenia: Należy naciągnąć i podłączyć zwody poziome, uzupełnić podpórki, podłączyć rynny do instalacji odgromowej oraz naprawić uziom R5.

Orzeczenie: Na podstawie przeprowadzonej kontroli instalację odgromową uznaje się za niezdatną do dalszej eksploatacji.


Ogłędziny wykonał
Podpis, nr świadectwa kwalifik.

Tomasz Lamparski
Upoważniony do pomiarów
elektrycznych
świadectwo kwalifikacje
Gr. 1 D/116/45/3eI/2021



Tab.1. Wyniki Pomiarów

L.p.	Urządzenia, uziom	Rezystancja uziemienia	Ocena skuteczności	Ciągłość przewodów odprowadzających zachowana
-		Ω	tak-nie	tak-nie
1	R1	1,88	tak	tak
2	R2	0,99	tak	tak
3	R3	0,71	tak	tak
4	R4	1,27	tak	tak
5	R5	30,10	nie	nie
6	R6	0,69	tak	tak

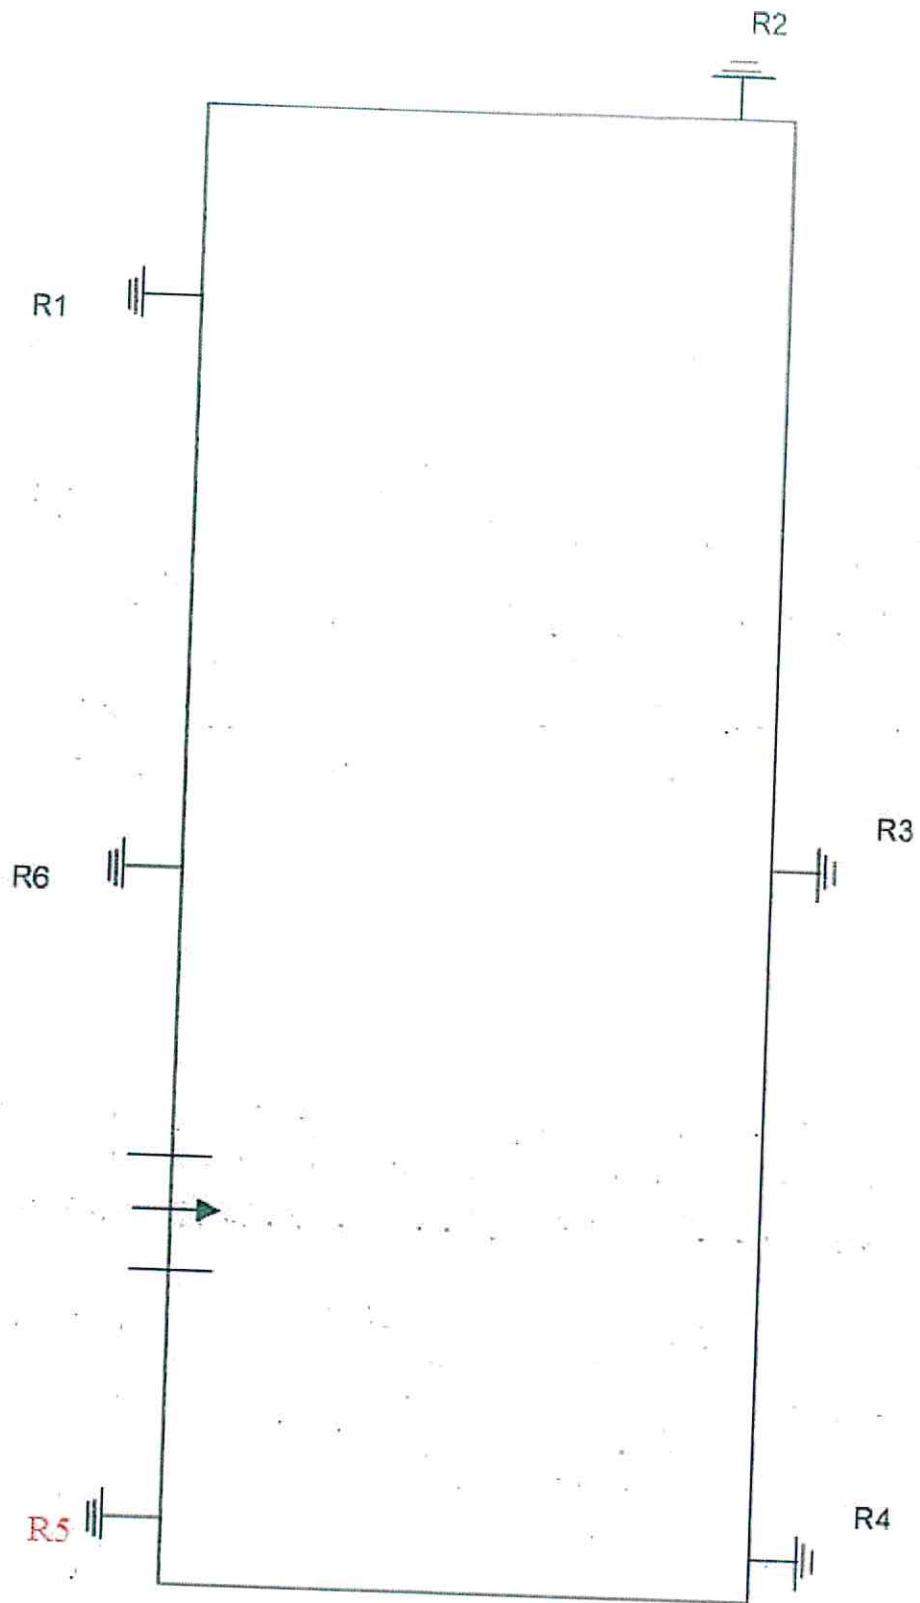

Rys. 1 Szkic instalacji odgromowej w budynku przy ul. Herberta 5
